





Vilniaus
rajo
savivaldybė


Vilniaus rajono savivaldybės administracijos veiklos rezultatai ir iššūkiai 2024 metais

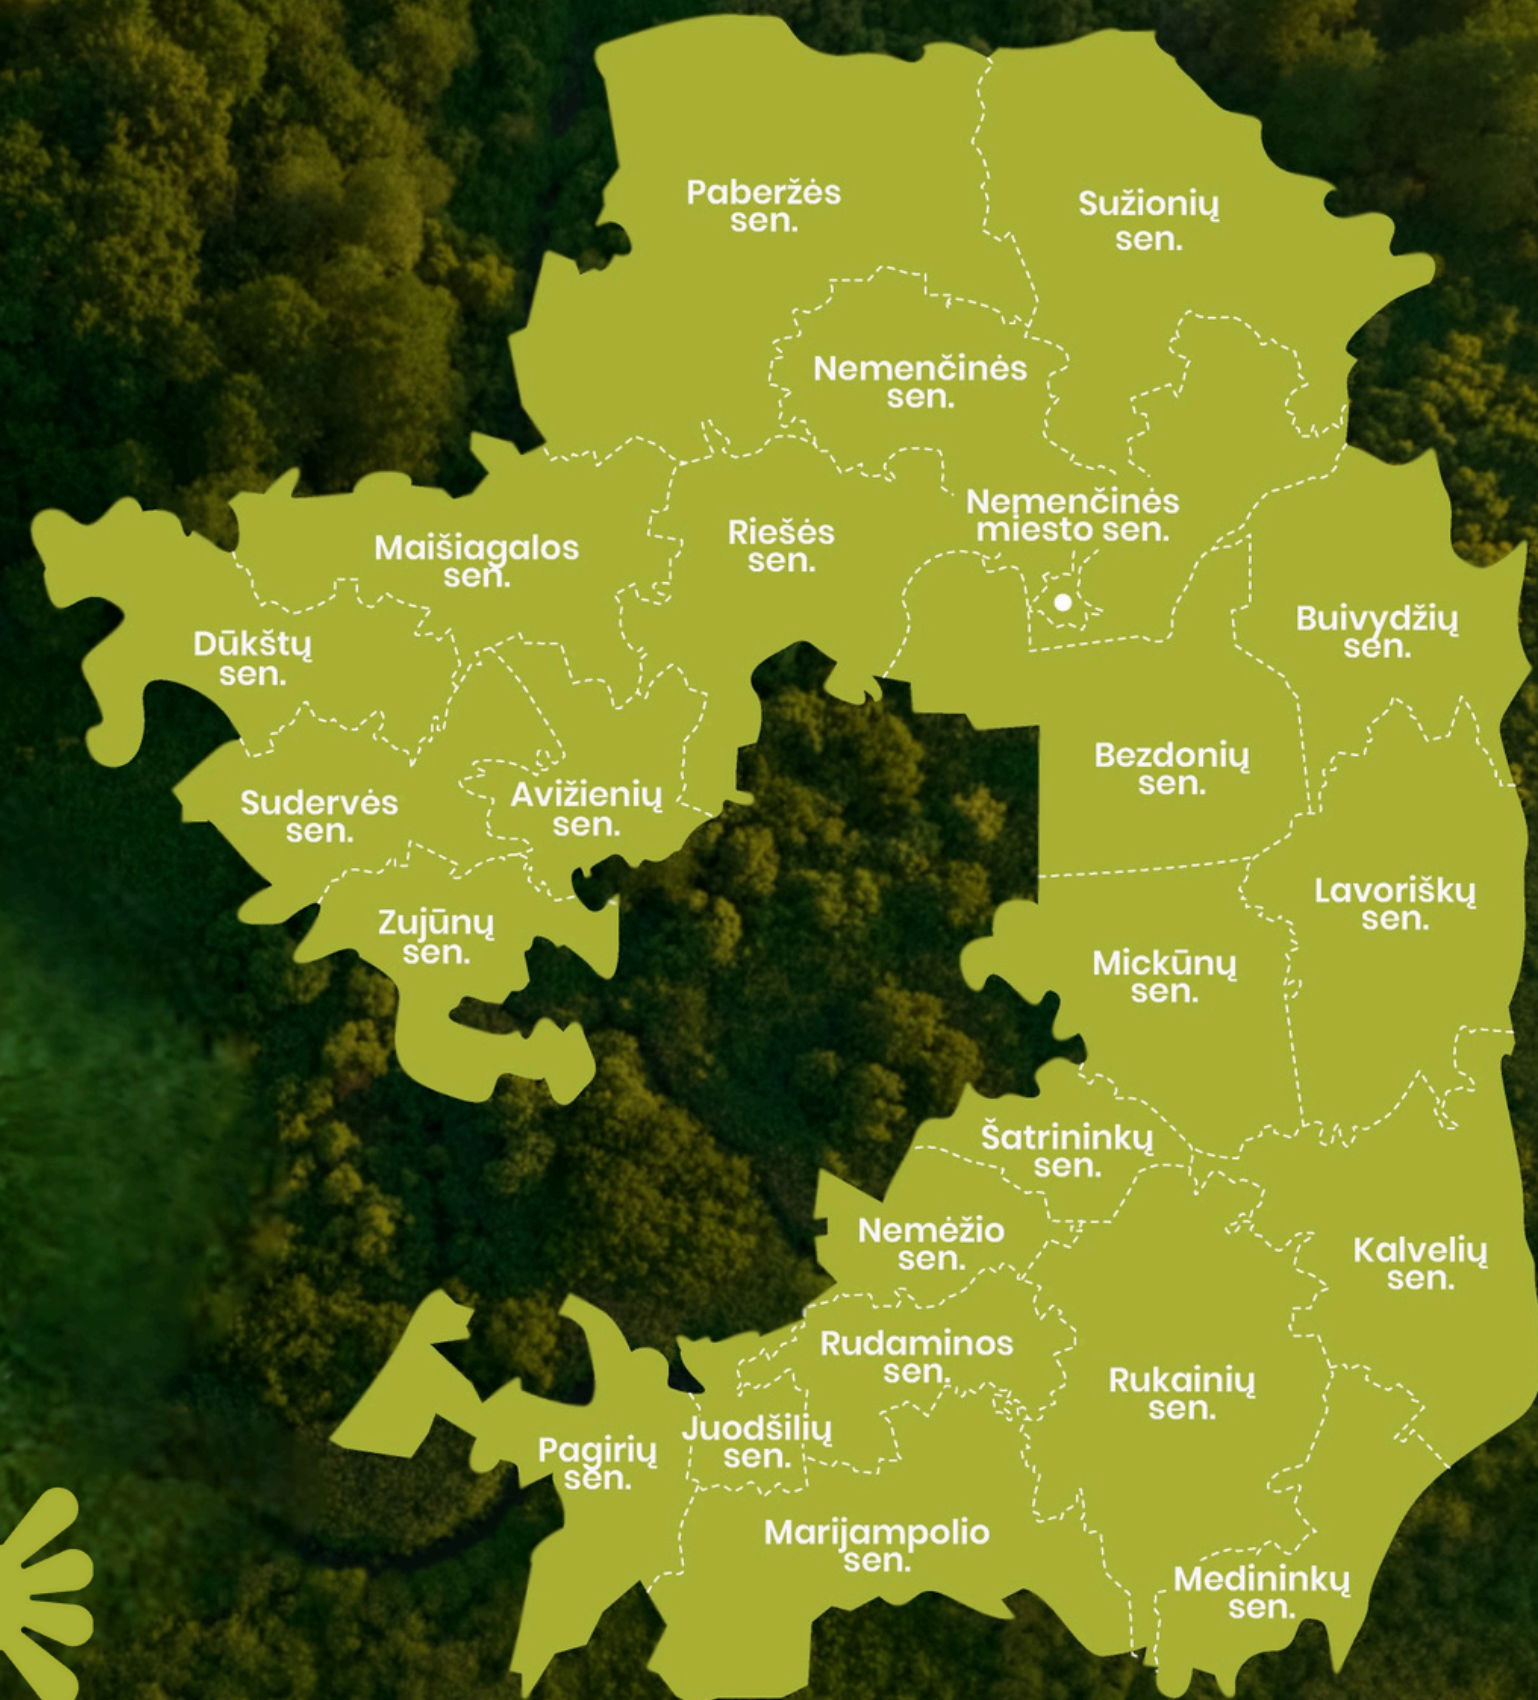

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS

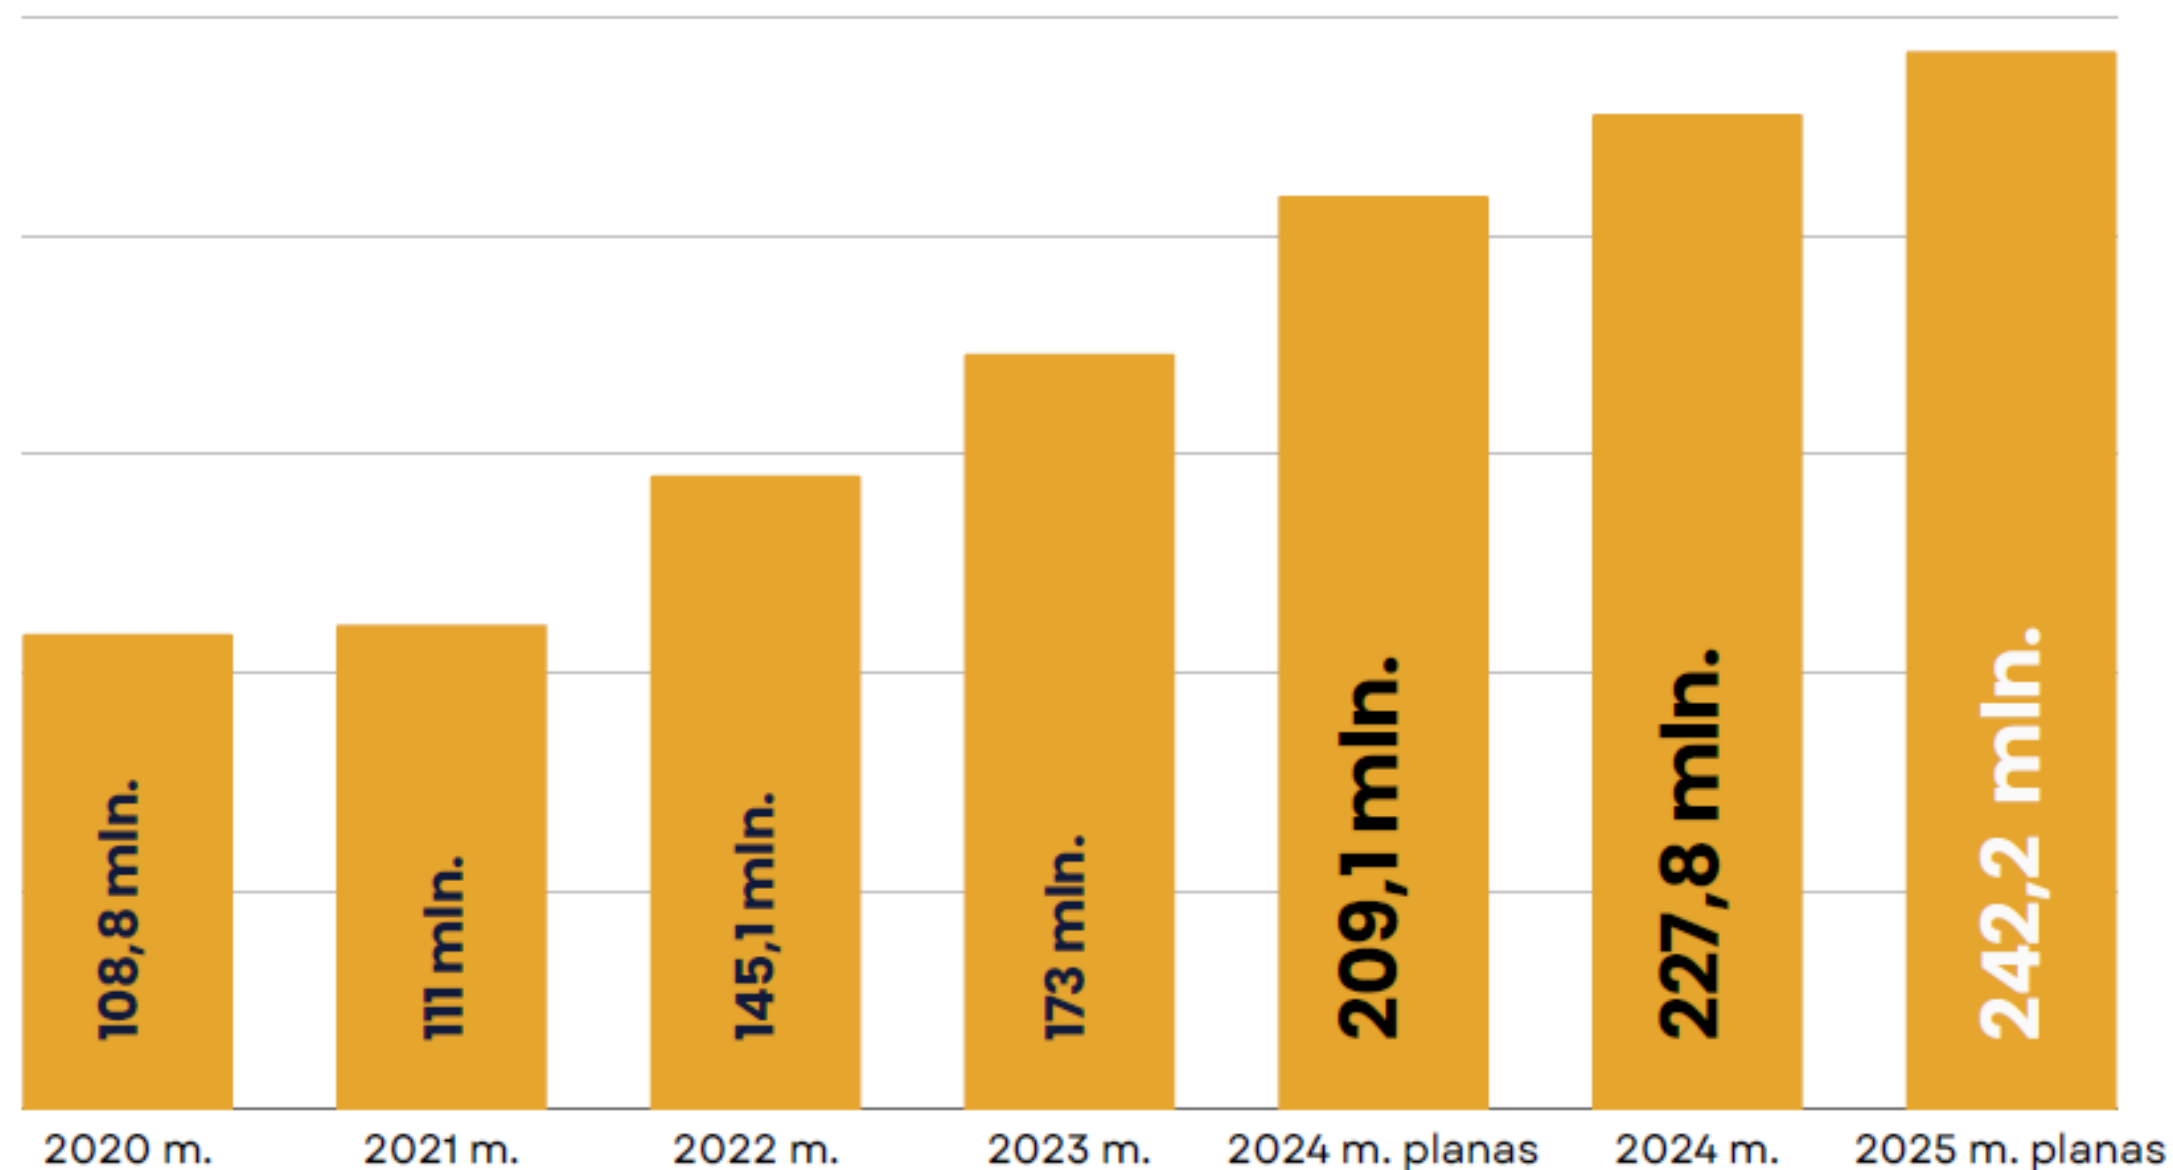

BIUDŽETAS PAGAL ASIGNAVIMUS 2024 M.




Patvirtintas planas 2024 m.: 209,1 mln. Eur

Patikslintas planas 2024 m.: 227,8 mln. Eur

- 1 – Ekonominio konkurencingumo didinimo programa
 - 2 – Švietimo kokybės ir prieinamumo gerinimo programa
 - 3 – Susisiekimo ir gatvių apšvietimo infrastruktūros gerinimo programa
 - 4 – Valdymo programa
- 5 – Saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimo programa
 - 6 – Viešųjų sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programa
 - 7 – Kultūros, sporto ir turizmo vystymo programa
 - 8 – Socialinės atskirties mažinimo programa

BIUDŽETAS PAGAL ASIGNAVIMUS | 2024 M. VS 2025 M. PROGNOZĖS

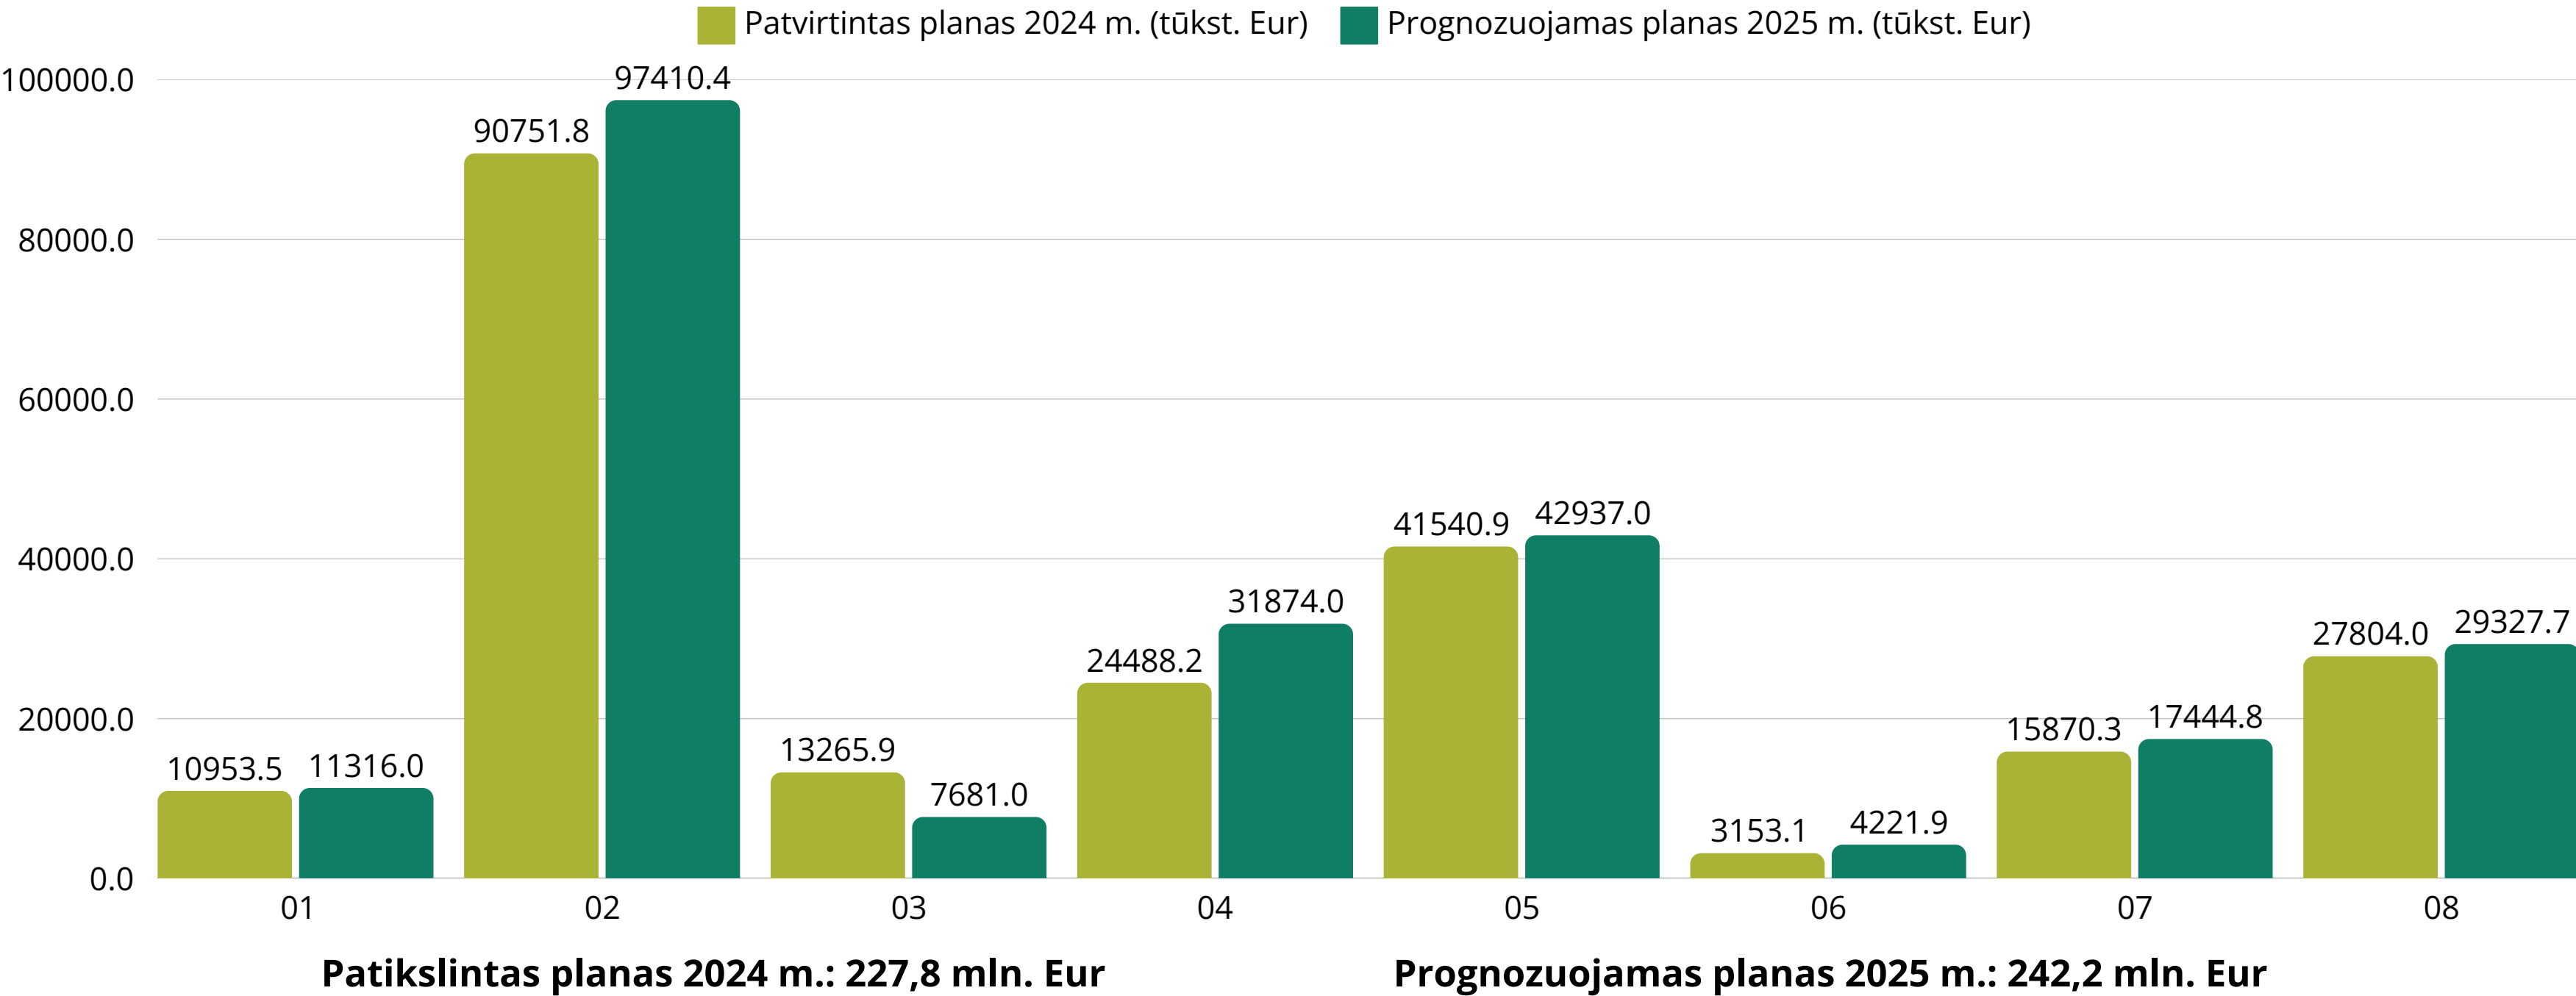

- 1 – Ekonominio konkurencingumo didinimo programa
- 2 – Švietimo kokybės ir prieinamumo gerinimo programa
- 3 – Susisiekimo ir gatvių apšvietimo infrastruktūros gerinimo programa
- 4 – Valdymo programa

- 5 – Saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimo programa
- 6 – Viešųjų sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programa
- 7 – Kultūros, sporto ir turizmo vystymo programa
- 8 – Socialinės atskirties mažinimo programa

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCESO ANALIZĖS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMAS

Esminės strateginės priemonės:

- **Šakinių skyrių nustatymas** – paskirtos užduotys parengti techninių specifikacijų standartus
- **Suplanuotas Pirkimų valdymo informacinės sistemos diegimas**
 - ES lėšomis finansuojamas projektas,
 - numatomas projekto biudžetas – 102 000 Eur, VRSA kofinansavimo lygis – 20 proc.,
 - numatomas įgyvendinimo terminas – 2025 m.
- **Sukurta veiklos efektyvumo stebėsenos sistema**

PIRKIMŲ CENTRALIZAVIMAS, OPTIMIZAVIMAS IR EFEKTYVINIMAS

Centralizuojant ir konsoliduojant pirkimus pirmiausia buvo siekiama padidinti pirkimų efektyvumą apjungiant homogeniškus pirkimo objektus. Tai leido sumažinti atskirų procedūrų skaičių ir užtikrinti geresnes kainas.

Siuo metu **sėkmingai centralizuoti pirkimai šiose srityse:**

- Elektros energijos pirkimas
- Transporto priemonių (mokyklinių mikroautobusų) pirkimas
- Maisto prekių pirkimas (ugdymo įstaigoms)
- Automobilinių degalų pirkimas

Centralizuojant pirkimus buvo sukurtos Dinaminės pirkimų sistemos (DPS).

DPS buvo sėkmingai pritaikytos šiose srityse:

- Kelių priežiūra žiemos metu
- Vadovėlių ir knygų įsigijimas
- Energetinių resursų (medžio granulių ir anglies) įsigijimas

Perspektyvinės (siūlomos) priemonės, siekiant didinti konsoliduojamų pirkimų rodiklius, optimizuoti ir efektyvinti pirkimus:

- Kompetencijų koncentravimas (šakiniai skyriai, suinteresuotųjų šalių įtraukimas į pirkimų procesą);
- Pirkimų poreikio vertinimo komisijos skyrimas, pirkimų planavimo proceso efektyvinimas;
- Pirkimų valdymo sistemos diegimas.

Perspektyviniai konsoliduojami/centralizuojami pirkimo objektai (sąrašas nėra baigtinis):

- Žaidimo aikštelių įrengimas ir jų priežiūros paslaugos
- Kompiuterinė įranga
- Kanceliarijos prekės
- Automobiliai

2024 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO VYKDYMAS

Plano įvykdymo rodiklis
83,4 proc. (331 iš 397)

Žaliųjų pirkimų rodiklis –
100 proc.

Centralizuotų pirkimų
vertė – 57,7 proc.

(inicijuotų pirkimų skaičius/bendras
pirkimo skaičius 2024 pirkimų plane)

Dažniausios pirkimų plano neįvykdymo priežastys:

- **Teisiniai ir administraciniai apribojimai** (užtruko SLD išdavimo procedūros, poreikis tikslinti projektinius sprendinius)
- **Pirkimo poreikio pokyčiai dėl įvairių priežasčių** (pirkimo objektas tampa neaktualus, užtrunka dokumentų derinimo procedūros)
- **Finansavimo pokyčiai** (nutraukimas, sutartys dėl paramos lėšų pasirašytos metų pabaigoje ir pan.)

	vnt.	Vertė Eur su PVM
Metų pradžioje planinių pirkimų (įskaitant 49 atskirai patvirtintas eilutes)	230	43 713 220,07
Panaikinti pirkimai	12	
Papildomų planinių pirkimų per metus	131	
Metų pabaigoje planinių pirkimų	348	65 924 231,52
Neplaniniai pirkimai per metus	49	421 512,45
Metų pabaigoje viso pirkimų planinių ir neplaninių	397	66 345 725,97
Neinicijuoti pirkimai iš viso	66	24 595 300,48
Iš jų MVP SA, SAK, AK	19	

2024 M.
PIRKIMŲ
PLANO
ĮVYKDYMO
SUVESTINĖ

PAGRINDINIAI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ RODIKLIAI



ŽALIEJI PIRKIMAI

	Žaliųjų pirkimų vertė (proc.)	Žaliųjų pirkimų skaičius (proc.)
Viniaus rajono savivaldybė	100	100
Bendras (Lietuvos)	95,8	99,2
Kauno rajono savivaldybė	98,7	98,7
Vilniaus miesto savivaldybė	99,5	94,7



CENTRALIZUOTI PIRKIMAI

	Centralizuotų pirkimų vertė, proc.	Centralizuotų pirkimų skaičius, proc.
Viniaus rajono savivaldybė	57,7	58,1
Bendras (Lietuvos)	42,2	28,1
Kauno rajono savivaldybė	29,8	55,7
Vilniaus miesto savivaldybė	42,2	28,1

SOCIALINIAI PROJEKTAI: IŠPLĖSTAS SOCIALINIO BŪSTO FONDAS



Nemenčinės socialinis būstas (15 butų)

Projekto vertė 3 mln. Eur
iš jų 1,4 mln. Eur – savivaldybės lėšos,
1,6 mln. Eur – ES lėšos

2024 m. panaudota 109 tūkst. Eur

SOCIALINIAI PROJEKTAI: RŪPINAMĖS SOCIALIAI PAŽEIDŽIAMAIS VISUOMENĖS NARIAIS



2024 m. Pikeliškėse atidaryti pirmieji grupinio gyvenimo namai (GGN), skirti asmenims, turintiems intelekto negalią ar kitų psichikos sveikatos sutrikimų



Šiuo metu Didžiojoje Riešėje (Mokyklos g. 10) GGN statybos ir įrengimo darbai yra baigti, registruojama Registrų centre. Atidarytas planuojamas pavasarį 2025 m.

Dienos užimtumo centras ir socialinės dirbtuvės taip pat esantys Didžiojoje Riešėje (Alyvų g. 20), duris planuoja atverti 2025 metų pavasarį.

Projektui įgyvendinti skirtas Europos Sąjungos finansavimas – 1,066 mln. Eur, savivaldybės lėšos sudarė 1,5 mln. Eur

2024 m. išleista beveik 850 tūkst. Eur

SPORTO PROJEKTAI



Naujas sporto aikštynas prie Avižienių gimnazijos

Darbų vertė siekia beveik 650 tūkst. Eur,
lėšas skyrė Vilniaus rajono savivaldybė



Daugiafunkcė sporto aikštelė Raudondvario kaime

Projekto vertė daugiau nei 103 tūkst. Eur, iš kurių ES
finansavimas sudaro apie 55 tūkst. Eur


VILNIAUS RAJONO KAPINIŲ DUOMENŲ REGISTRAS

2024 m. pradėtos projekto „**Vilniaus rajono kapinių duomenų skaitmeninimas**“ veiklos, kurių metu siekiama inventorizuoti duomenis skaitmenizuojant visą su palaidojimu susijusią informaciją ir įnešti lengvos prieigos aspektą į palaidojimų informacijos paieškos sritį.

Planuojama, kad projektas bus įgyvendintas 2025 m.

Jo bendra vertė siekia daugiau nei 120 tūkst. Eur.
Projektas vykdomas savivaldybės lėšomis.

2024 m. panaudota 40 tūkst. Eur.





MOZŪRIŠKIŲ DVARO ŽELDYNŲ TERITORIJOS KRAŠTOVAIZDŽIO AREALO SUTVARKYMAS BEI MOZŪRIŠKIŲ DVARO ATNAUJINIMAS

Projekto vertė 610 tūkst. Eur, iš kurių ES finansavimas sudaro apie 125,5 tūkst. Eur

2024 m. panaudota virš 345 tūkst. Eur


Mozūriškių dvaro rekonstrukcijos projekto vertė 1,7 mln. Eur. Projektas finansuojamas SB ir VB lėšomis.

Šiuo metu yra perkami baldai bei įranga.
2024 m. panaudota virš 470 tūkst. Eur




PROJEKTAI: VIEŠOSIOS ERDVĖS

Pagirių k. rekreacinės teritorijos rekonstravimas ir pritaikymas kultūros ir vietos bendruomenės reikmėms

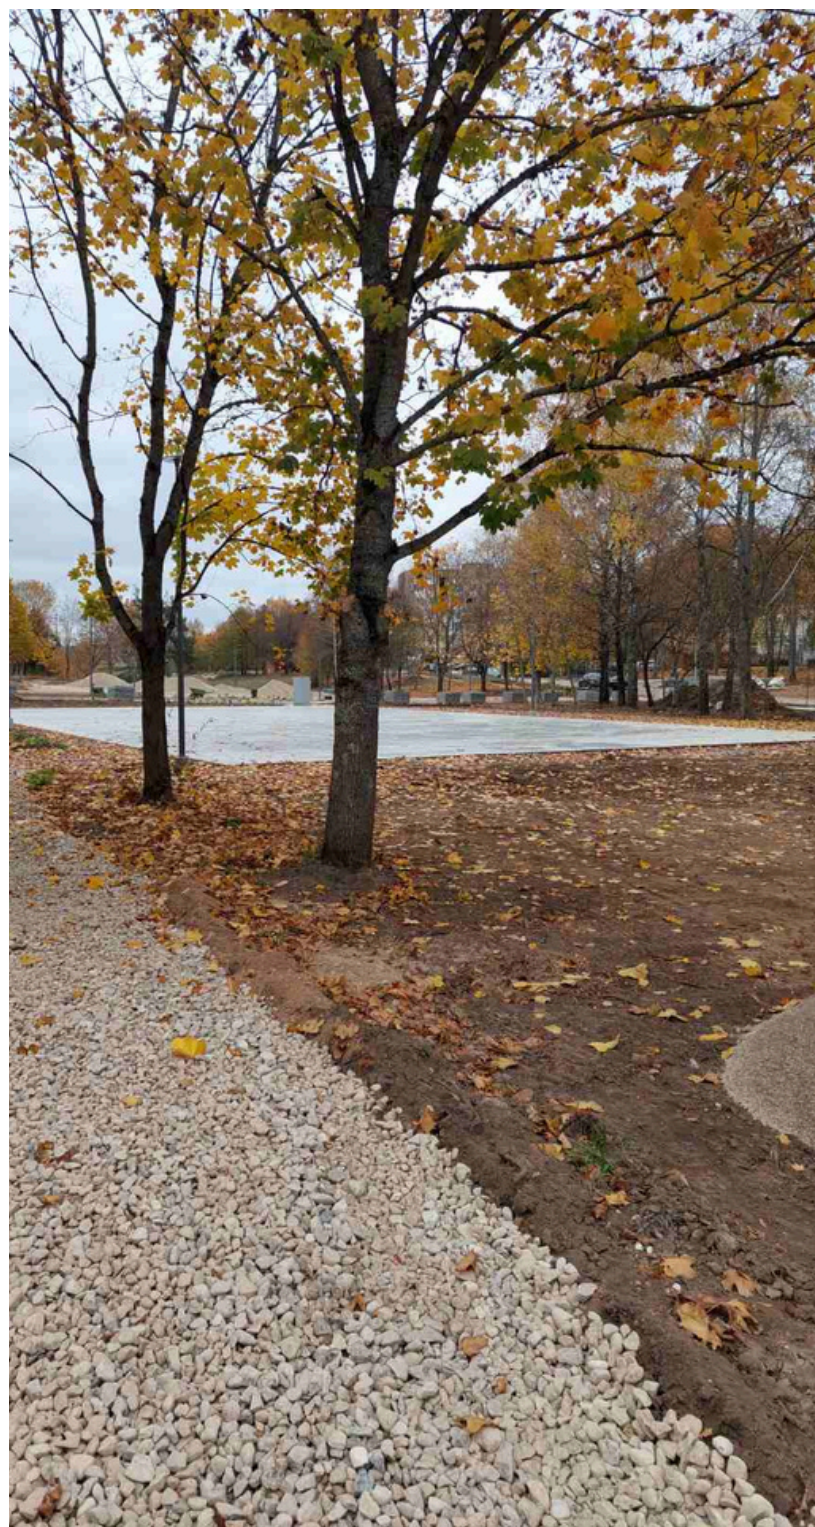

PAGIRIŲ PARKAS

Sutvarkyta viešoji erdvė:
takų, apželdinimo,
estrados, vaikų
žaidimų aikštelės
įrengimas

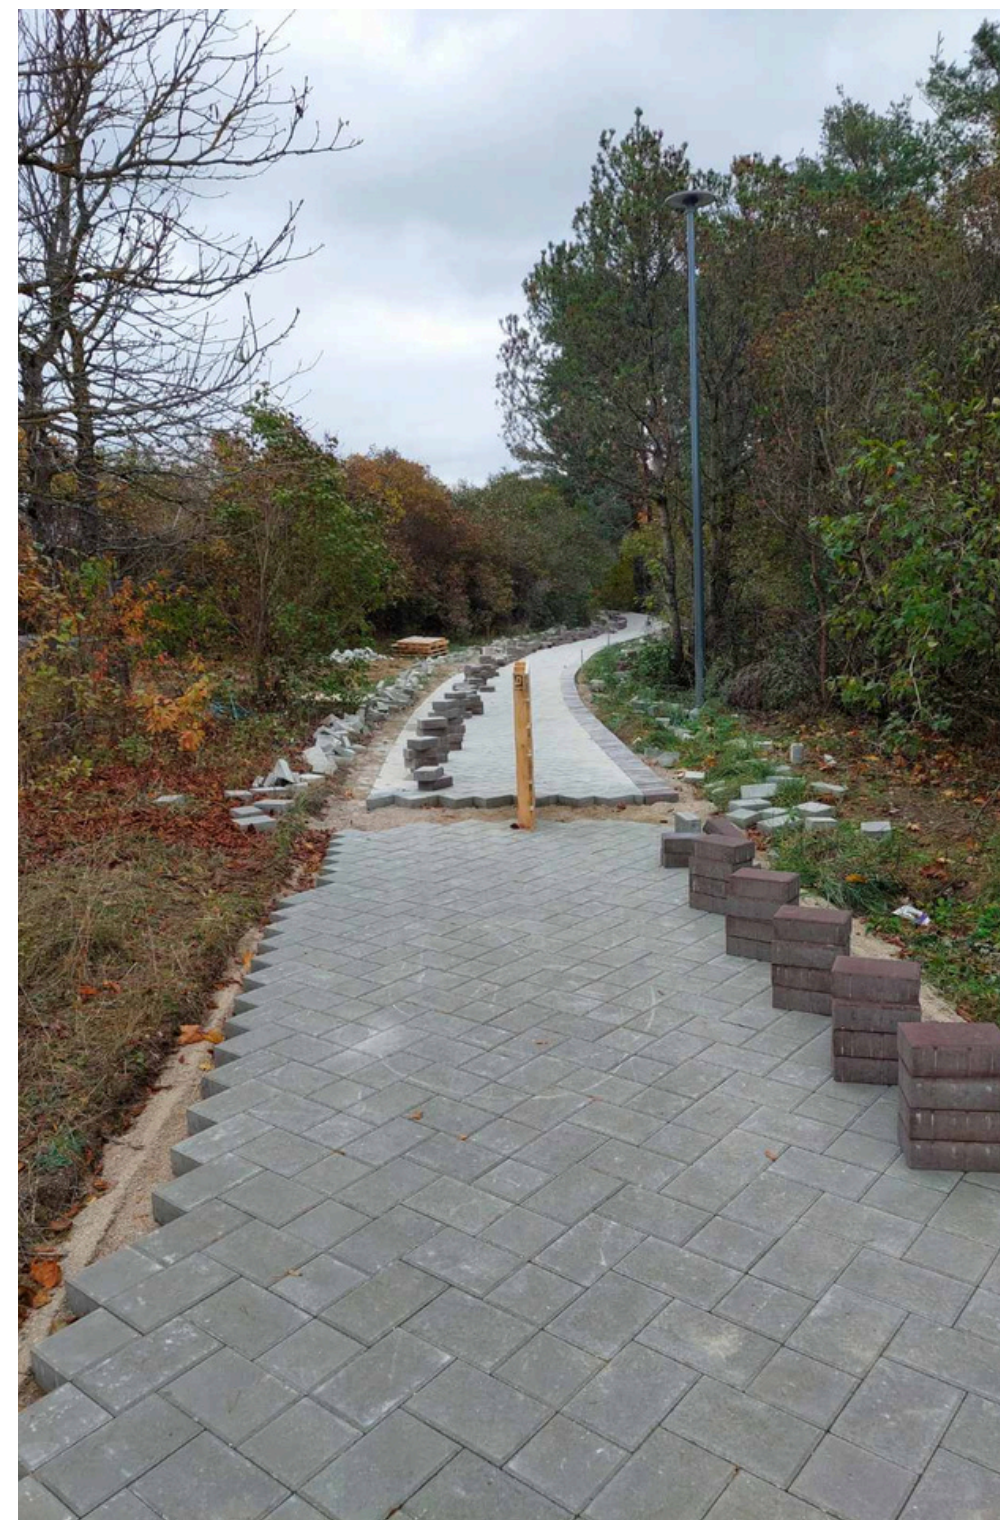

Projekto vertė
2,2 mln. Eur

Finansuojama iš
SB lėšų

2024 m. panaudota
daugiau nei 0,5 mln. Eur

Planuojama baigti
2026 m.

UGDYMO ĮSTAIGŲ ATNAUJINIMAS

- ▶ Modernizuotos **Sudervės M. Zdziechovskio pagrindinės mokyklos** mokymosi erdvės – suremontuotos patalpos, šildymo sistema bei pakeista elektros instaliacija, vandentiekio ir kanalizacijos tinklai
Projektas finansuojamas SB lėšomis, vertė beveik 0,7 mln. Eur
- ▶ Pradėti **Rastinėnų ugdymo skyriaus modernizavimo darbai.**
Sutvarkytas stogas.
2024 m. investuota 140 tūkst. Eur Liko darbų už 200 tūkst. Eur (sienų sutvirtinimas ir apšiltinimas)
- ▶ Vyko **Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos** modernizavimas su aktų salės ir muzikos mokyklos pastatų statybos darbai. 2024 m. pastatytas muzikos mokyklos pastatas
Projekto pabaiga planuojama 2026 m.
2024 m. investuota virš 1,5 mln. Eur iš savivaldybės ir valstybės lėšų



SPORTO KOMPLEKSO INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS RUDAMINOJE



Komplekse bus 25 m 4 takeliai, baseinas su pakeliamu dugnu, sporto, treniruoklių salė, SPA zona ir kavinė

2015 m. buvo parengtas projektas, kuris šiuo metu bus rengiamas iš naujo. Projektą planuojama įgyvendinti VPSP būdu – valdžios ir privataus sektoriaus partnerystė, kai projektavimo ir statybos darbams skiriama iki 30 mėn., operavimo laikotarpis – 15 metų. Pasibaigus VPSP sutarčiai, baseino pastatas lieka Savivaldybei.

Per visą operavimo laikotarpį privatus partneris suteikia Savivaldybei nemokamas paslaugas – baseino takelių nuomą nuo 8 iki 17 val. darbo dienomis, sporto salių nuomą – nustatytą apsilankymų skaičių darbo dienomis, privatus partneris suteikia nuolaidas mokamoms paslaugoms Savivaldybės nustatytoms tikslinėms grupėms.

2025-01-13 buvo gauta CPVA teigiama išvada dėl privataus subjekto atrankos dokumentų atitikimo metodinių dokumentų reikalavimams.

Šuo metu kuriama atskira viešųjų pirkimų komisija šiam pirkimui atlikti (įtraukiami ir išoriniai ekspertai)

Etapai:

- Pirkimo vykdymas 7-9 mėnesiai;
- Sutarties išankstinių sąlygų įvykdymas 1-2 mėnesiai
- Planuojamas terminas iki sutarties pasirašymo – 12 mėnesių

UŽSITĘSĘ PROJEKTAI



RUDAMINOS TURGAVIETĖS REKONSTRUKCIJA

Projekto vertė apie 3 mln. Eur

Pradžia – **2016 m.**

Terminas – buvo planuota 2024 m.

2024 m. panaudota 1,1 mln. eurų

Atlikti darbai: pagrindų įrengimas, kelio ir vejos bortų montavimas, dangų įrengimas, lauko elektros trūkstamų komunikacijų įrengimas, lauko vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų trūkstamų komunikacijų įrengimas ir kt.

Šiuo metu yra inicijuojamas pirkimas likusiems darbams įsigyti

Projektas dalinai finansuojamas iš struktūrinės paramos lėšų.

Kyla rizika grąžinti lėšas, nepanaudotas pagal paskirtį



UŽSITĘSĘ PROJEKTAI

SKAIDIŠKIŲ SPORTO KOMPLEKSO STATYBA IR VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMAS PRITAIKANT BENDRUOMENĖS POREIKIAMS

Projektas įgyvendinamas

Projektas po gruntų tyrimų suskaidytas į 2 etapus:

1. Parko teritorija
2. Sporto aikštelės

Pagal 1 etapą darbai yra atnaujinti, dėl 2 etapo derinami sprendiniai

Planuojama baigti 2025 m.

Vertė – apie 5 mln. Eur. 2024 m. panaudota 700 tūkst. Eur

Projekto problema: dėl itin blogų gruntų buvo sustabdyti darbai, futbolo aikštės įrengimo darbams prireiks daugiau lėšų, nenumatytos vietos žiūrovams



Bus įrengta: sporto salė, trys patalpos užsiėmimams, dušai, persirengimo kambariai.
Lauke: parkas, 2 lauko teniso kortai, krepšinio aikštelė, 2 paplūdimio tinklinio aikštelės, futbolo stadionas, minigolfas.

UŽSITĘSĘ PROJEKTAI

Paberžės socialinių globos namų priestato statyba

Projekto pradžia: **2016 m.**

2024 m. buvo **nutraukta darbų sutartis su bankrutavusiu rangovu.**

2024-08 buvo pasirašyta su nauju rangovu.

Darbus planuojama pabaigti 2025-09

2024 m. panaudota 137 tūkst. Eur (padėtos perdangos, įrengtas stogas).

Projekto vertė 900 tūkst. Eur

Vilniaus r. Egliškių šv. Jono Bosko gimnazijos II etapo B korpuso statyba ir teritorijos sutvarkymas

Projekto vertė 3 mln. Eur.

2024 metais panaudota 17 tūkst. techninio projekto atnaujinimui.

2024 m. **dėl pasibaigusių ESO sąlygų termino** reikėjo iš naujo parengti ESO tinklų iškėlimo projektą (derinamas ESO).

Taip pat reikėjo atnaujinti projektą pagal naujas galiojančias normas.

Projektas atnaujintas. 2025-03-04 planuojama skelbti darbų pirkimą.

Terminas 2026 m.



Bus įrengtas jungiamasis korpusas su holu, kuriame bus įrengta apie 10 naujų klasių, patalpos mokytojams, personalui

SAVIVALDYBĖ SĖKMINGAI INVESTUOJA Į SVEIKATOS SRITĮ


Sveikatos centro įkūrimas

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais
Projektui skirta 2,4 mln. eurų (ES ir VB lėšos). Projekto pabaiga 2026 m.
Veiklos: Mickūnų ambulatorijos, Juodšilių ambulatorijos, VŠĮ VRP ir VŠĮ Nemenčinės poliklinikos patalpų remontai, baldų ir įrangos įsigijimas
2024 m. įgyvendinta veiklų 218 tūkst. Eur sumai

Vilniaus rajono ilgalaikės priežiūros mobilių komandų aprūpinimas įranga

Vilniaus rajono poliklinikos, Nemenčinės poliklinikos ir V. Staliulionienės bendros praktikos gydytojo kabineto, 3 mobilių komandų aprūpinimas įranga, įsigyjant medicininę ir kompiuterinę įrangą Vilniaus rajone ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiančioms mobilioms komandoms.

Projektui skirta 60 tūkst. Eur (ES ir VB biudžeto lėšos)
2024 m. įsigyta visa numatyta įranga

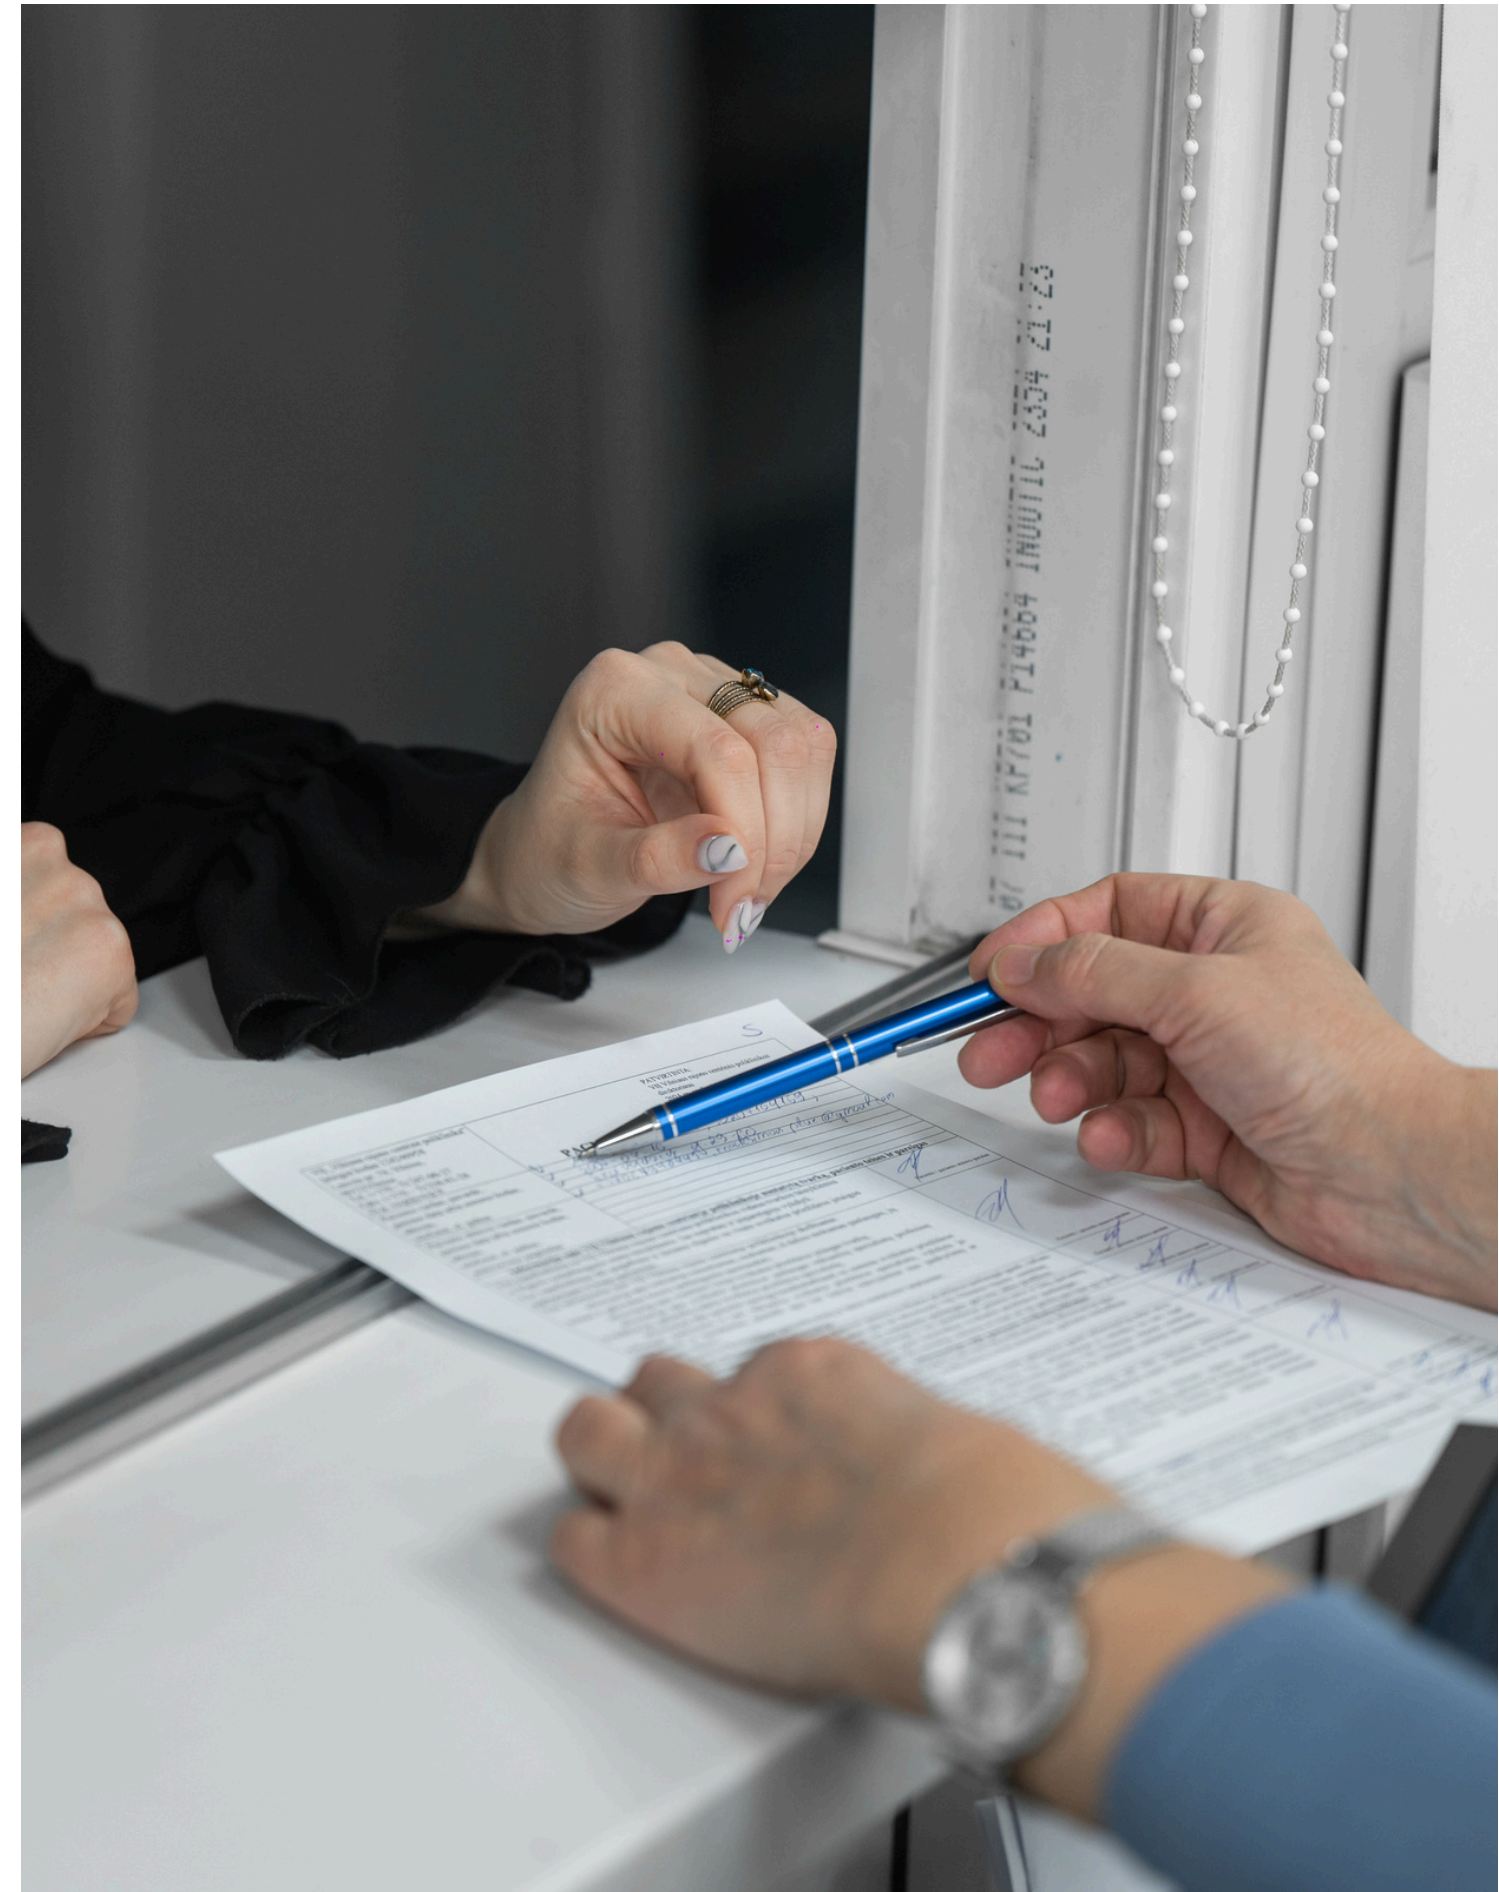

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Įstaiga įregistruota **2024 m. spalio 30 d.**


Veiklą pradėjo **2025 m. sausio 1 d.**

Sveikatos biuro veiklų startui iš savivaldybės biudžeto skirta **50 tūkst. Eur**

Iki šiol apie 16 metų visuomenės sveikatinimo funkcijas Vilniaus rajone sutarčių pagrindu vykdė Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuras

Biuro komanda, besirūpindama rajono gyventojų sveikata:

- organizuos veiklas, stiprinančias psichikos sveikatą
- skatins formuoti sveikatai palankios mitybos įgūdžius
- organizuos fizinio aktyvumo veiklas
- vykdys sveikatos stebėseną
- didins sveikatos raštingumą traumų, sužalojimų, užkrečiamųjų ligų prevencijos, burnos sveikatos ir sveikos gyvensenos srityse



Logotipas vaizduoja darnų susikibusių žmonių ratą ir
Vilniaus rajoną – didelių galimybių žaliajį žiedą

SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

2024 m. Pikeliškėse atidaryti pirmieji grupinio gyvenimo namai (GGN)

Šeiminių namų įrengimas Sudervės sen., Putiniškių k.

SB lėšos – 1,0 mln. Eur

Pastato užbaigtumas: 80 proc.

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2026 m. I ketv.

Atidaryti dar 2 bendruomeniniai vaikų globos namai Nemenčinės seniūnijoje

Projektą įgyvendino Savivaldybė kartu su partneriu VŠĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras“

Projekto vertė siekė 490 tūkst. Eur

Visos lėšos buvo skirtos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų



Pikeliškėse atidaryti pirmieji grupinio gyvenimo namai (GGN)



Bendruomeniniai vaikų globos namai Nemenčinės seniūnijoje

SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA | 2024 M. PRADĖTI DARBAI

Projektas „Grupinio apgyvendinimo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje“

Įgyvendinus projektą būtų įsteigti 3 grupinio gyvenimo namai, kuriuose bus sukurta 30 vietų (kiekviename po 10 žmonių)

Adresai: Paberžės sen., Visalaukės I k., Jaunimo g. 2 ir Marijampolio sen., Parudaminio k., Mokyklos g. 1A, Šatrininkų sen. Karklėnų k., Aukštoji g. 19

Planuojama projekto pradžia 2025 m. IV ketv., pabaiga 2028 m. IV ketv.

Planuojamas finansavimas: projekto vertė – 2 800 000,00 Eur (VRSA lėšos – 420 000,00 Eur, ES – 2 380 000,00 Eur)

Šiuo metu yra užbaigiamas Investicinis projektas. Šiais metais planuojama inicijuoti techninius projektus, teikti paraišką bei pasirašyti finansavimo sutartis.

Projektas „Apsaugoto būsto plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje“

Projekto tikslas – užtikrinti apsaugoto būsto prieinamumą tikslinei gyventojų grupei Vilniaus rajone

Planuojama įsigyti Vilniaus rajone 12 apsaugotų būstų (sukurti iki 24 naujų vietų – asmenims, turintiems intelekto ir (ar) psichikos negalią).

Planuojama projekto pradžia 2025 m. IV ketv., pabaiga 2028 m. IV ketv.

Planuojamas finansavimas: Projekto vertė – 1 200 000,00 Eur (VRSA lėšos – 180 000,00 Eur, ES – 1 020 000,00 Eur).

Šiuo metu yra užbaigiamas Investicinis projektas. Šiais metais planuojama teikti paraišką bei pasirašyti finansavimo sutartį.

SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA | 2024 M. PRADĖTI DARBAI

Dienos užimtumo centras asmenims su negalia statyba Vilniaus rajono savivaldybėje“ Keturiasdešimt Totorių k.

Savivaldybė jau steigia 1 DUC/SD (D. Riešės sen.), kuriose paslaugas gaus 32 asmenys. Tačiau šis rodiklis nėra pakankamas, todėl **įsteigus dar vieną** DUC Keturiasdešimt Totorių k. (1 objektas – 25 vietos: 20 vietų užimtumo veiklai ir 5 – atokvėpio paslaugoms teikti), Savivaldybėje bus sukurtos 57 vietos užimtumo paslaugoms organizuoti.

Projekto vertė 2,5 mln. Eur, iš jų SB lėšos – 375 tūkst. Eur, ES lėšos 1,250 mln., ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos – 875 tūkst. Eur.

Projekto sutarties pasirašymo data 2025 m. III ketv., įgyvendinimo pabaiga 2028 m. IV ketv.

Projektas ekspertuojamas

Socialinės globos namų senyvo amžiaus žmonėms įrengimas Vilniaus rajono savivaldybėje

Numatoma nugriauti seną mokyklos statinį ir statyti naują ir tvarų pastatą, Rukainių sen. Senasalio k., Senasalio g. 79.

Įgyvendinus projektą bus įkurta nauja patraukli socialinių paslaugų įstaiga, kurioje atsiras iki 40 naujų vietų socialinių paslaugų gavėjams – senyvo amžiaus asmenims.

Projekto preliminarinė vertė 2,2 mln. Eur, iš jų SB lėšos – 330 tūkst. Eur, ES lėšos 1,1 mln. Eur, ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos – 770 tūkst. Eur.

Finansavimo sutarties pasirašymo data planuojama 2025 m. IV ketv., įgyvendinimo pabaiga 2028 m. IV ketv.

Projektavimas pirkimo stadijoje

SOCIALINIŲ ĮSTAIGŲ FINANSAVIMAS (IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO)

Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centras
402 200,00 Eur (darbo užmokestis 356 400,00 Eur)

Paberžės socialinės globos namai
739 694,32 (darbo užmokestis 350 103,80 Eur)

**Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių
paslaugų centras**
1 359 005,54 Eur

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras
1 239 072,00 Eur (darbo užmokestis 1 069 800,00 Eur)



Kuosinės socialinės globos namai

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
1 473 100,00 Eur (darbo užmokestis 1 179 531,26 Eur)


BĮ Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras
917 545,11 Eur (darbo užmokestis 666 389,46 Eur)

BĮ Kuosinės socialinės globos namai
418199,59 Eur (darbo užmokestis 403400,00 Eur)

Socialinės gerovės skyrius
9 062 231,68 Eur (darbo užmokestis 375 964,54 Eur)




INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS LĖŠOS

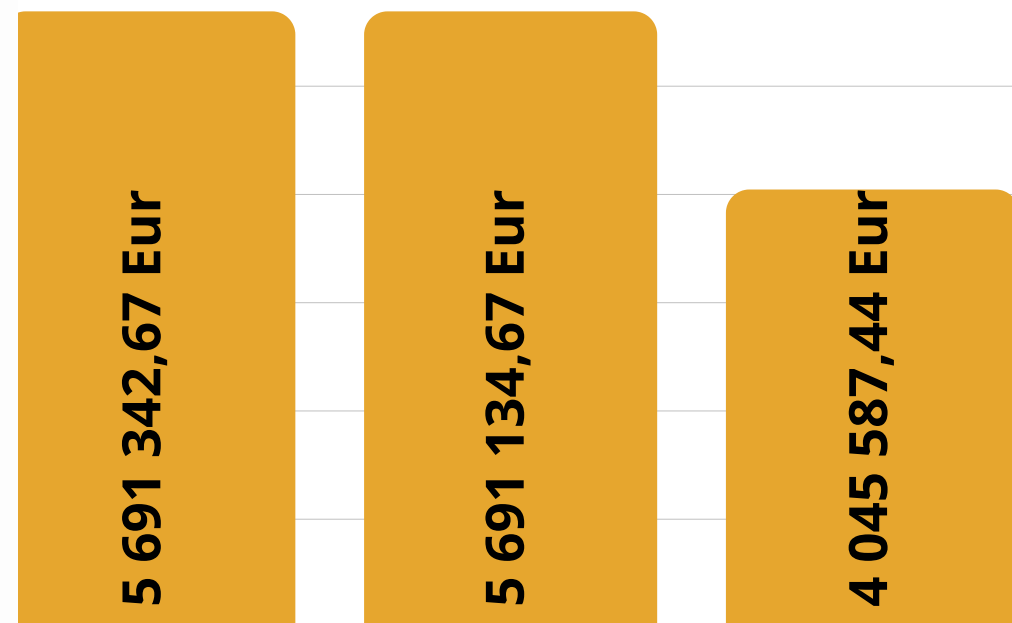


2022 m. surinktos lėšos 2023 m. numatytos naudojimui lėšos 2023 m. panaudotos lėšos

2023 m. panaudota 71 % lėšų



2023 m. surinktos lėšos 2024 m. numatytos naudojimui lėšos 2024 m. panaudotos lėšos

2024 m. panaudota 89 % lėšų

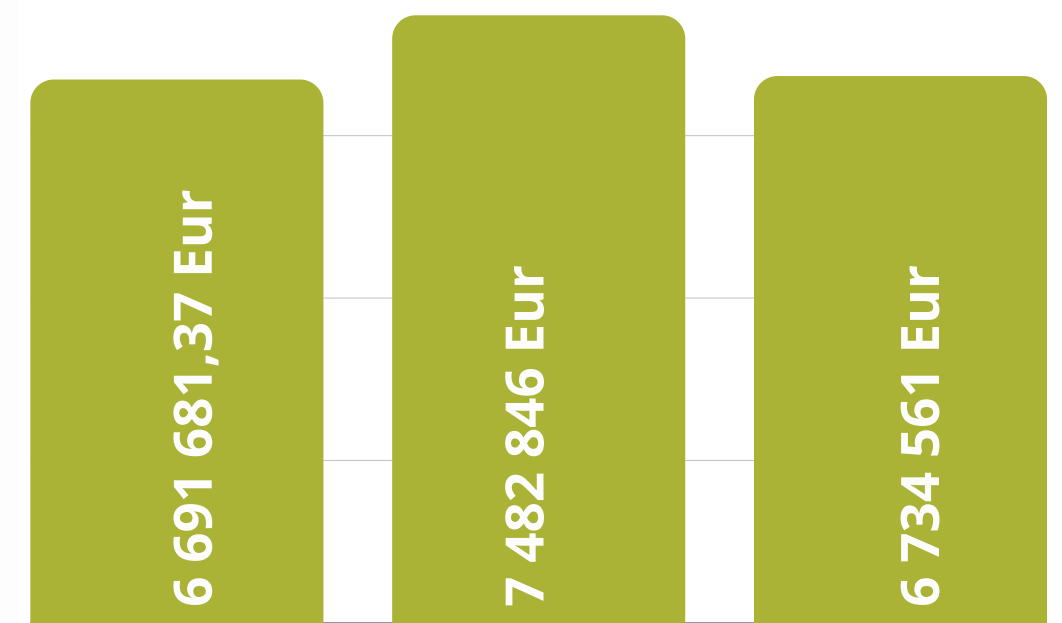

2024 m. surinktos lėšos 2025 m. numatytos naudojimui lėšos 2025 m. planuojamos panaudoti lėšos

2025 m. planuojama panaudoti 90 % lėšų

INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS LĖŠOS



Vilniaus r. Didžiosios Riešės vaikų darželio
statyba



Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio
pagrindinės mokyklos mokymosi erdvių
modernizavimas



Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio
gimnazijos sporto salės statyba



Universalios sporto aikštelės įrengimas
prie Vilniaus r. Kyviškių pagrindinės
mokyklos

INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS LĖŠOS



Rudaminos kaimo turgavietės
rekonstrukcija



Rudaminos kultūros centro
rekonstrukcija ir patalpų remontas



Rekreacinės teritorijos rekonstravimas ir
pritaikymas kultūros ir vietos
bendruomenės reikmėms Pagiriu kaime



Skaidiškių sporto komplekso statyba ir
viešųjų erdvių sutvarkymas pritaikant
bendruomenės poreikiams

INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS LĖŠOS



Eismo saugos priemonių diegimas Mickūnų seniūnijoje nuo Užupio g. 33 iki Mickūnų geležinkelio stoties



Upės g. (Zujūnų sen.) kapitalinis remontas



Česlovo Milošo g. (Geležių k., Balandiškių k., Maskoliškių k., Pūstalaukio k., Pilikonių k., Leičių k., Zujūnų sen.) kapitalinis remontas



DALINAI PADENGTI MOKESČIAI UŽ VANDENĮ IR CENTRALIZUOTAI TEIKIAMĄ ŠILUMĄ

01.01.04.06 priemonė Subsidijų už vandens tiekimą teikimas

01.01.04.07 priemonė Subsidijų už centralizuotai tiekiamą šiluminę energiją teikimas



SUBSIDIJOS GERIAMAJAM VANDENIUI IR NUOTEKŲ TVARKYMOUI

- 2024 m. pradžioje numatyta 800 tūkst. Eur
- Po VERT kainų perskaičiavimo UAB „Nemėžio komunalininkas“ (padidėjus kainai) faktiškai išmokėta subsidijų 1 355,0 tūkst. Eur



SUBSIDIJOS UŽ CENTRALIZUOTAI TIEKIAMĄ ŠILUMINĘ ENERGIJĄ

- 2024 m. pradžioje numatyta 1 380,0 tūkst. Eur
- Sumažėjus šilumos energijos kainai bei dėl šiltesnių orų sumažėjus suvartojimui – panaudota mažiau nei planuota – 933,0 tūkst. Eur



VANDENTVARKOS ŪKIS



05.01.01.01 priemonė Komunalinio ūkio infrastruktūros plėtra

Atlikti ir inicijuoti darbai:

- Nuotekų siurblių automatinio valdymo sistemos rekonstrukcija **Valčiūnų k., Juodšilių k., Pagirių k.** (50 838 Eur)
- Nuotekų tinklo rekonstrukcija Nemėžio sen., **Skaidiškių k.** (65 000 Eur)
- **Nemėžio k.** nuotekų valymo įrenginių projektavimas (114 500 Eur)
- UAB „Nemėžio komunalininkas“ sudaryta sanitarinių apsaugos zonų įteisinimo paslaugų teikimo sutartis (vertė 118 500 Eur), UAB „Nemenčinės komunalininkas“ (45 715 Eur), skirta 14 300 Eur
- Pradėtas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtros projektas Pagirių sen., **Vaidotų k., Statybininkų g.** projektavimas, skirta 2 000 Eur
- Atlikta buitinių nuotekų siurblinės rekonstrukcija **Nemėžio k.** (116 070 Eur)
- Paviršinių nuotekų tinklų eksploatavimas ir įrengimas (126 217 Eur)
- Išpildomosios dokumentacijos parengimas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų inventorizacijai atlikti / atlikta tinklų inventorizacija, skirta 41 991 Eur

VANDENTVARKOS ŪKIS

05.01.01.01 priemonė Komunalinio ūkio infrastruktūros plėtra

- **Skaidiškių k., Sodų g.** vandentiekio projektavimas ir statyba (29 840 Eur)
- Atliktas **Mickūnų mstl.** vandentiekio projektavimas ir statyba (21 350) Eur
- Atlikta nuotekų tinklų statyba **Skaidiškių k., Faustinos g.**, skirta 65 000 Eur
- Atlikti vandentiekio tinklų atkarpų rekonstrukcijos darbai **Bukiškio k., Avižienių k. ir Riešės k. bei Maišiagalos mstl.**, skirta 450 462 Eur
- Atlikti nuotekų tvarkymo tinklų statybos darbai **Pakalnės, Paberžės, Pievų g., Maišiagalos mstl.**, skirta 31 500 Eur
- Atlikti vandens gerinimo įrenginių statybos **Beržų g., Riešės k., Avižienių sen.** darbai prie seno gręžinio, skirta 78 900 Eur
- Atliktas **Beržų g. / Suopių g. Riešės k., Avižienių sen.** požeminio vandens gavybos gręžinio ir vandens gerinimo įrenginių projektavimas su įrengimu, skirta 131 200 Eur
- Atlikta nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija **Raudondvario k., Riešės sen.**, skirta 179 000 Eur
- Pradėti **Sužionių k.** geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros II etapo statybos darbai (statybos rangos darbų sutarties vertė 450 000 Eur), skirta 87 657,64 Eur



**IKI 50 % KOMPENSACIJA
INDIVIDUALIŲ BUITINIŲ
NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ
ĮSIGIJIMUI IR ĮRENGIMUI**

2024 m. išnagrinėta 400 paraiškų
kompensacija skirta **200 namų ūkių**
bendra suma: **195 670 Eur**

VANDENTVARKOS ŪKIS

05.01.01.01 priemonė Komunalinio ūkio infrastruktūros plėtra

Planuota, bet neįgyvendinta:

- Planuota skirti 11 900 Eur vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos **Sužionių k., Sužionių sen.** (I etapas) užbaigimui, neatlikta, nes **negautas pritarimas dėl nuotekų siurblinės apsaugos zonos patekimo į miško žemę**. Lėšos perkeltos nuotekų siurblinės Pergalės g., Riešės k., Avižienių sen., rekonstrukcijai
- Planuota skirti 90 000 Eur **Kazimieravo k., Paberžės sen.**, vandens gerinimo įrenginių statybai. Gavus **VMVT raštą dėl vandens kokybės** Šventininkų k., Buivydžių sen., lėšos buvo perkeltos minėtos vietovės vandens gerinimo įrenginių statybai (56 300 Eur) ir nuotekų siurblinės Klevų g., Avižienių k. rekonstrukcijai (7 000 Eur)
- Planuota skirti 3 000 Eur **Kranto g. 14, Nemenčinės m.** lietaus kanalizacijos atšakos įrengimui su projektavimu. **Nenupirkti rangos darbai**. Lėšos perkeltos nuotekų siurblinės Klevų g., Avižienių k. rekonstrukcijai
- **Kriaučiūnai, Vilniaus m.** vandens gerinimo įrenginių įrengimas (**žemės sklypas priklauso keliems bendraturčiams, nepateikia sutikimo įrengimui**)
- **Rudaminos k.** nuotekų siurblinės rekonstrukcija (**neišspręsti nuosavybės teisės klausimai**)
- **Rudaminos k.** vandenvietės projektavimas ir statyba (**nėra žemės sklypo vandenvietės įrengimui**)
- Vandens gerinimo įrenginių **Medininkų sen., Laibiškių k.** projektavimas ir statyba (**žemės sklypui nesudaryta panaudos sutartis**)



ŠILUMOS ŪKIS

05.01.01.01 priemonė Komunalinio ūkio infrastruktūros plėtra

Vykdoma Skaidiškių k. biokuro katilinės statyba

2024 m. skirta 1 783 400 Eur | 465 075,57 Eur gauta parama

2025 m. numatoma darbų pabaiga

Lėšų poreikis 1 585 000 Eur

Atlikta UAB „Nemėžio komunalininkas“ centralizuotų šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija:

- Vėliučionių k. (86 877 Eur)
- Valčiūnų k., 240 m (I katilinė) (90 000 Eur)
- Kalvelių k. (86 200 Eur)
- Valčiūnų k., 500 m (II katilinė) (186 600 Eur)
- **Vykdoma** Buivydiškių k. katilinės rekonstrukcija, įrengiant 2 biokuro granulinius po 1 MW katilus (160 000 Eur), lėšų poreikis 2025 m. – 1 523 250 Eur



Atlikta UAB „Nemenčinės komunalininkas“ katilinių rekonstrukcija:

- Buivydiškių k. katilinės rekonstrukcija įrengiant dujinį 3 MW katilą (109 900 Eur)
- Avižienių k., Gėlių g. 4 650 kW katilo įrengimas (63 000 Eur)
- Paberžės katilinės biokuro katilo įrengimas (31 600 Eur)
- Atliktas šilumokaičių keitimas Sudervės g. 9, Avižienių, Buivydiškių, Bukiškio katilinėse (75 000 Eur)
- Atliktas dumtraukio keitimas Maišiagalos katilinėje (60 000 Eur)
- Atliktas Ežero g., Nemenčinės katilinėje kamino keitimas (42 200 Eur)

INVESTICIJOS

Į ŠILUMOS ŪKĮ

Atlikta UAB „Nemenčinės komunalininkas“ centralizuotų šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija:

- Nemenčinėje (248 600 Eur)
- Kreivalaužių k. (skirta 90 200 Eur)
- Maišiagalos mstl. (106 500 Eur)
- Bukiškio k. (92 700 Eur)

VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS RENOVAVIMAS IR LVN TINKLŲ PLĖTRA VILNIAUS RAJONE

- Atliktas **Lavoriškių k.** geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros projektavimas. 185 gyventojai galės prisijungti prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų. 2024 m. skirta 2 744 Eur
- Pradėta geriamojo vandens gavybos ir geriamojo vandens ruošimo įrenginių rekonstrukcija **Skaidiškių k.** (vertė 1 689 750 Eur, 2024 m. skirta 1 689 75 Eur) ir **Nemėžio k.**
- Inicijuotas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projektas **Mickūnų mstl.** Vertė 3 227 811 Eur
- Inicijuotas nuotekų tinklų statybos projektas **Šumsko mstl.** Skaičiuotina vertė pagal investicinį projektą 2 361 108 Eur
- Pradėtas paviršinių nuotekų surinkimo sistemos statybos projektavimo ir statybos projektas **Galgių k.**, Vakario, Mokyklos gatvėse. 2024 m. skirta 21 840 Eur
- Pradėti **Dūkštų k.** geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statybos darbai (statybos rangos darbų sutarties vertė 1 868 000 Eur). 2024 m. skirta 608 000 Eur
- Atliktas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros projektavimas **Bezdonių mstl.** (skirta 36 454 Eur)
- Atliktas **Buivydžių I k.** geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros projektavimas, skirta 15 522 Eur
- Investicinių projektų įgyvendinimo plano parengimui skirta 9 000 Eur
- Pradėti **Buivydžių I k.** geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statybos darbai (statybos rangos darbų vertė 1 203 700 Eur). 2024 m. skirta 8 700 Eur
- Planuotas **Nemėžio sen., Kuprioniškių k.** Vilties, Ažuolyno g. lietaus nuotekų sistemos projektavimas neįgyvendintas, nes komisijoje nuspręsta, kad reikia planuoti kompleksiskai su asfalto dangos, griovių, šulinių projektavimu
- Planuotas **Skaidiškių k.**, Sodų g. 5 paviršinių nuotekų tinklų projektavimas atliktas, tačiau gauta neigiama ekspertizės išvada



Parengti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros investiciniai projektai:

- ✓ Lavoriškių k.
- ✓ Šumsko mstl.
- ✓ Mickūnų mstl.
- ✓ Skaidiškių k.
- ✓ Nemėžio k.
- ✓ Dūkštų k.
- ✓ Buivydžių I k.
- ✓ Bezdonių mstl.

Vertė: 32 600 Eur

VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS RENOVAVIMAS IR LVN TINKLŲ PLĖTRA VILNIAUS RAJONE

05.01.01.22 priemonė Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilniaus rajone

Įgyvendinta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Grigaičių k. dalyje (Vilniaus miesto aglomeracija).

Grigaičių k. dalyje buvo įrengta 5 km vandentiekio ir 6 km nuotekų surinkimo tinklų bei sudarytos galimybės prisijungti preliminariai 631 gyventojui prie nuotekų tinklų ir 640 gyventojų prie vandentiekio tinklų.

2024 m. skirta 400 000 Eur iš Savivaldybės biudžeto.



KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMAS IR TVARKYMAS

05.01.02.01 priemonė Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas, administravimas

▶ 4 500,0 tūkst. Eur

buvo skirta 2024 m. pradžioje rinkliavos už atliekų tvarkymą mokėjimams

▶ 5 183,0 tūkst. Eur

panaudota faktiškai



KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMAS IR TVARKYMAS

05.01.02.15 priemonė Konteinerių aikštelių įrengimas/rekonstrukcija ir konteinerių įsigijimas konteinerių aikštelėms

05.01.02.13 priemonės Atliekų tvarkymo sistemos sukūrima

250

įrengta antžeminių konteinerių atliekų
surinkimo aikštelių

1 664

įgyta konteinerių

3 320 129 Eur

projekto vertė

17 785 vnt.

rulonų buvo įsigyta oranžinių maišelių
maisto atliekoms

23 455 Eur

bendra maišelių kaina

5 000

kompostavimo dėžių
bendra vertė 374 555 Eur

60 vnt.

bendro naudojimo rūšiavimo
konteinerių komplektų

115 579 Eur

suma

16 000 kompl.

pradėti dokumentų derinimai dėl individualių
pakuočių atliekų surinkimo konteinerių pirkimo

2024 m. **planuota įsigyti 3 600 individualių rūšiavimo konteinerių komplektų** už 180 000,00 Eur.
Pagal poreikį sudaryta sutartis dėl **3 600 vnt.** 240 l talpos konteinerių popieriaus / plastiko / metalo pakuočių atliekoms ir
3 100 vnt. 120 l talpos konteinerių stiklo pakuočių atliekoms pirkimo. Bendra kaina 157 285,48 Eur.

APLINKOS TERŠIMO MAŽINIMO PRIEMONĖS

05.02.02.01 priemonė



SOSNOVSKIO BARŠČIO NAIKINIMAS

seniūnijoms Sosnovskio barščio
naikinimui skirta 21 tūkst. Eur



ASBESTO ATLIEKŲ SURINKIMAS

viršytas planas:
planuota 500 t., surinkta 938,02 t.
Skirta 116 tūkst. Eur



INVAZINIŲ ŠLIUŽŲ NAIKINIMAS

2024 m. įgyvendintas invazinių šliužų
gausos reguliavimo planas.
Naikinimo darbų vertė –
apie 50 tūkst. Eur

APLINKOS TERŠIMO MAŽINIMO PRIEMONĖS: APLINKOSAUGINIAI PROJEKTAI

05.02.02.01 priemonė

APLINKOS MONITORINGAS

2024 m. pateikta paraiška dėl projekto „Stiprinti savivaldybių aplinkos oro monitoringą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje“ įgyvendinimo.

2024 m. gruodžio 23 d. pasirašytą finansavimo sutartis. Vertė: 96 778,82 Eur

Problemos sprendimas – ES, savivaldybės lėšų pagalba bus sudaromos sąlygos vertinti ir prognozuoti aplinkos pokyčius bei galimas pasekmes. Tai leistų rengti atitinkamas rekomendacijas, planuoti neigiamo poveikio aplinkai mažinimo programas. Padidintų visuomenės, specialistų, valstybinių institucijų informavimą apie Vilniaus rajono aplinkos būklę.

Projekto įgyvendinimo metu bus įrengta aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelė (Pagirių k., Durpių ir Pagirių g. sankryžoje), skirta kietųjų dalelių KD_{2,5} koncentracijos aplinkos ore matavimams atlikti, siekiant stebėti individualių namų ir pramonės įmonių sukuriamą aplinkos oro taršą bei matavimų duomenys bus tinkami naudoti valstybinio aplinkos (oro) monitoringo tikslams, o indikatorinių matuoklių įrengimas kiekvienoje seniūnijoje leis vertinti bendrą aplinkos oro taršą.

Bendrai finansuoja Europos Sąjunga.

PROJEKTAS „ECOCAMP – KIEKVIENAS GALI GYVENTI EKOLOGIŠKIAU“

Savivaldybė dalyvauja projekte, kuris vykdomas pagal Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą, kartu su pagrindiniu partneriu Didžiųjų Masūrijos ežerų apsaugos fondu ir partneriu Gižycko valsčiumi (Lenkijos Respublika).

Projekto vertė – 51.073,73 Eur

Projekto tikslas – įtraukti Lenkijos ir Lietuvos pasienio regionų gyventojus į veiklas, susijusias su gamtos apsauga, biologine įvairove ir taršos mažinimu, suorganizuoti keturis tarpvalstybinius edukacinius ir ekologinius renginius (2 temines stovyklas ir 2 festivalius), kurių tikslas kelti ekologinį sąmoningumą ir stiprinti vietos bendruomenių bendradarbiavimą.

Šiuo metu inicijuojamas bendradarbiavimo sutarties pasirašymas.

PARAMA DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ REMONTUI

08.01.01.22 priemonė Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektams remti

2024 m. planuota skirti 350 tūkst. Eur paramos
25 daugiabučių namų butų savininkams

44

gautos paraiškos
349,9 tūkst. Eur sumai



38

butų savininkai pasinaudojo
parama
338,5 tūkst. Eur sumai



Kvartalinė renovacija –
gyventojams atnaujinus
daugiabučius, savivaldybė
tvarko aplinką

Prieš



Po



STATYBA

- 2024 m. išduota 1 210 statybą leidžiančių dokumentų
- IS Infostatyboje patikrinta 5 370 prašymų išduoti statybą leidžiantį dokumentą
- IS Infostatyboje patikrinta 710 prašymų atnaujinti informaciją apie statytoją (-jus) statybą leidžiančiame dokumente
- Išduota 15 pažymų apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto objektų galimybę naudoti pagal paskirtį





KELIŲ IR GATVIŲ INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS

- Iš viso per 2020-2024 m. užregistruota 61,1 proc. vietinės reikšmės kelių ir gatvių nuo bendro kelių (gatvių) skaičiaus. Neregistruotų inžinerinių statinių dalis – 38,9 proc.
- 2024 m. už 103,0 tūkst. Eur buvo įrengta 27 vnt. greitį mažinančių kalnelių ir už 25,7 tūkst. Eur – 147 vnt. kelio ženklų
- Vietinės reikšmės viešiesiems keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti 2024 m.:
 - Savivaldybė skyrė apie **8,1 mln. Eur** savo biudžeto lėšų,
 - beveik **5,9 mln. Eur** iš Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) ir
 - apie **3,56 mln. Eur** iš Savivaldybės Infrastruktūros plėtros rėmimo programos



KELIŲ IR GATVIŲ INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS

2023 m.

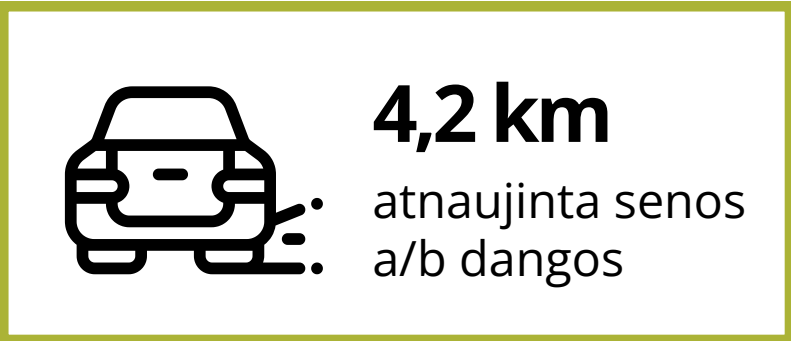

2024 m.



2024 m. pasiekti rekordiniai
kelių infrastruktūros
gerinimo rodikliai



Siekdama išvaduoti gyventojus iš dulkių,
Vilniaus rajono savivaldybė pirmoji Lietuvoje
2024-aisiais ėmė laistyti žvyrkelius

KELIŲ IR GATVIŲ INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS

2024 m. svarstyta 12 gyventojų prašymų dėl 50 proc. finansavimo tvarkant vietinės reikšmės kelius ir gatves, dalyvaujant fiziniams ar juridiniams asmenims.

2024 m. objektai:

- Dūkštų sen., Brinkiškių k., Vilnojos 3-ioji g. (Nr. VL9238) ir Vilnojos 4-oji g. (Nr. VL9239) atlikti kapitalinio remonto darbai. Atlikta darbų už maždaug 75 tūkst. Eur (gyventojai prisidėjo beveik 36 tūkst. Eur). Išasfaltuota apie 0,280 km ilgio atkarpa.
- Didžiosios Riešės k. atlikti Vieversių gatvės (VL9915) atkarpos kapitalinio remonto darbai. Atlikta darbų už maždaug 145 tūkst. Eur (gyventojai prisidėjo maždaug 70 tūkst. Eur). Išasfaltuota apie 0,350 km ilgio atkarpa.

Taip pat per 2024 metus pasirašytos 5 projektavimo darbų atlikimo sutartys:

- Galgių k., Privažiuojamojo kelio prie Vilniaus miesto ribos nuo kelio Nr. VL8432 (Nr. VL8554, ilgis apie 151 m) kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas
- Antežerių k., Ežero g. (Nr. VL7402, ilgis apie 180 m) kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas
- Galgių k., Rožių g. (Nr. VL8442, ilgis apie 202 m) kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas
- Skaidiškių k., Kiparių g. (Nr. VL7239, ilgis apie 224 m) kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas
- Didžiųjų Gulbinų k., Spindulio g. (Nr. VL9912, ilgis apie 350 m) kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas



KELIŲ IR GATVIŲ INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS

2024 m. įgyvendinti didžiausi objektai:

Lindiniškių k. Riešės g. (VL7926), Lindiniškių k. Ilgosios g. (VL9801), Lindiniškių k. Lindiniškių g. (VL7927), Lindiniškių k. Liepų g. (VL9803) nuo Riešės k. Riešės g. iki Bukiškio k. Liepų g. Avižienių sen.

Galinės k., Aukštųjų Rusokų vs., Mažosios Riešės vs. Galinės ir Kalno gatvių (VL9812; VL9813; VL9814; VL7972) nuo valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5237 iki valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5214 Avižienių sen.

Zujūnų seniūnijos Leičių k. Česlovo Milošo g. (Nr. VL7448), Pilikonių k. Česlovo Milošo g. (Nr. VL7449), Pūstalaukio k. Česlovo Milošo g. (Nr. VL7450), Maskoliškių kaimo Česlovo Milošo g. (Nr. VL7451), Balandiškių k. Česlovo Milošo g. (Nr. VL7452), Geležių k. Česlovo Milošo g. (Nr. VL7453)

Pagirių seniūnijos, Juodoji Vokė—Merešlėnai (Nr. VL1124)
2024 m. skirtos lėšos: 0,55 mln. Eur. 2024 m. išasfaltuota 3,0 km

2024 m. gautas statybą leidžiantis dokumentas Avižienių sen., Bukiškio k., Nesvyžiaus g. rekonstrukcijai. Darbų pradžia: 2025 m.

LIKO 1,3 KM

2020–2024 m. skirtos lėšos: 2,2 mln. Eur
Sutvarkytas ilgis: 1,85 km

2024 m. skirtos lėšos: 1,5 mln. Eur
Sutvarkytas ilgis: 0,9 km

LIKO 0 KM


2020–2024 m. skirtos lėšos: 3,44 mln. Eur
Sutvarkytas ilgis: 2,77 km

2024 m. skirtos lėšos: 1,05 mln. Eur
Sutvarkytas ilgis: 0,58 km

LIKO 0 KM

2020–2024 m. skirtos lėšos: 2,24 mln. Eur
Sutvarkytas ilgis: 4,29 km

2024 m. skirtos lėšos: 1,06 mln. Eur
Sutvarkytas ilgis: 1,52 km

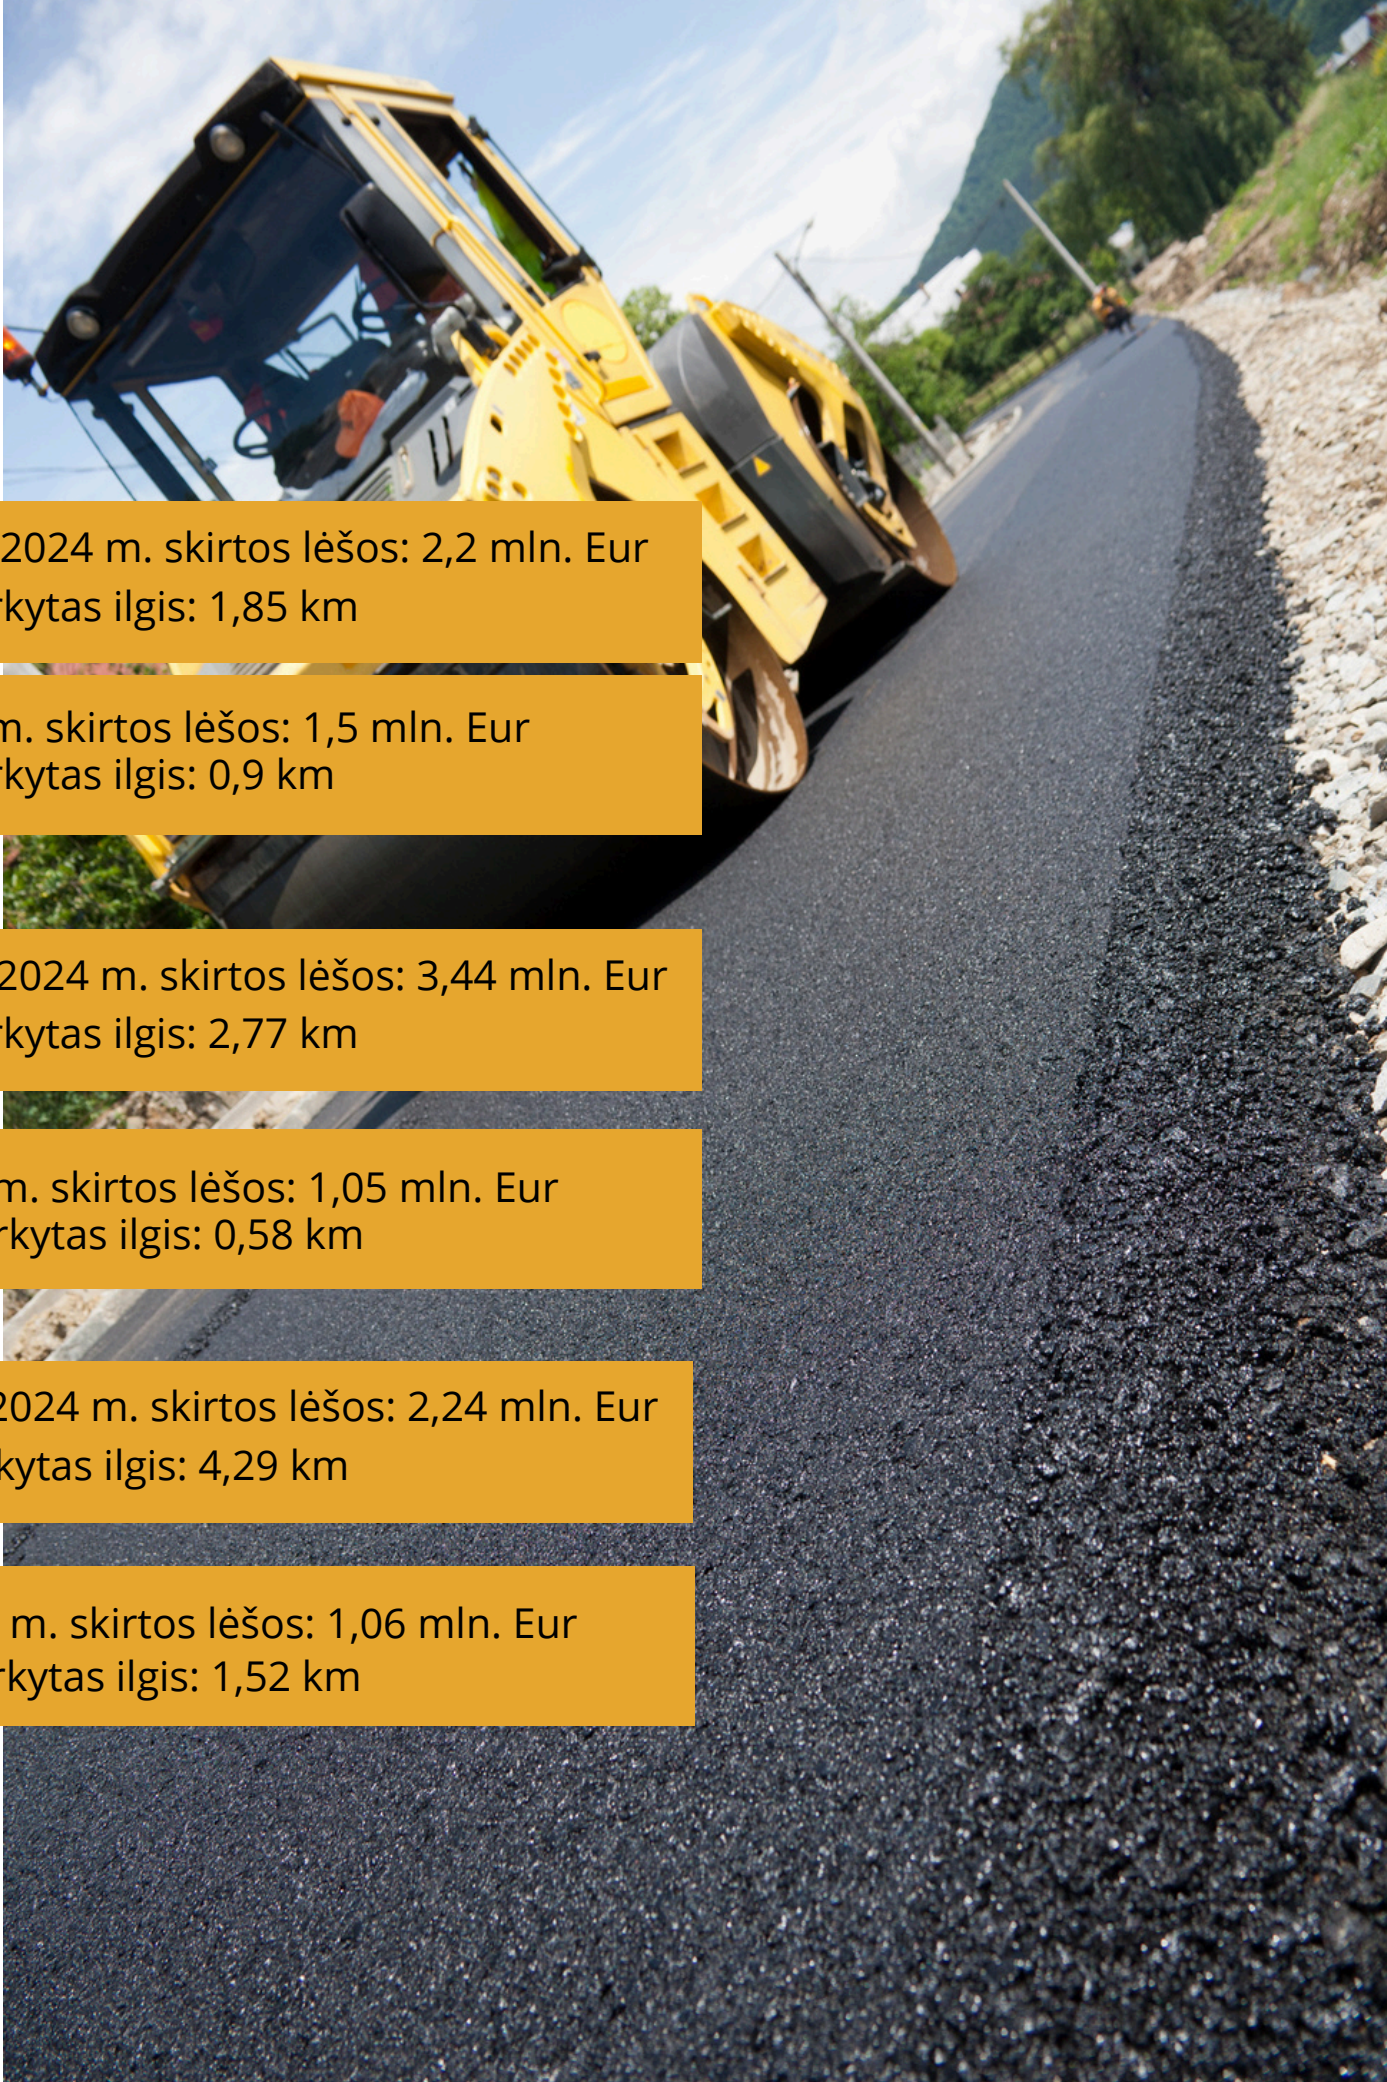

Kiti didesni objektai 2024 m.

- VL7926 Riešės g., Lindiniškių k., VL9801 Ilgosios g., Lindiniškių k., VL7927 Lindiniškių g., Lindiniškių k., VL9803 Liepų g., Lindiniškių k. nuo Riešės k. Riešės g. iki Bukiškio k. Liepų g., **Avižienių sen.** kapitalinis remontas (asfaltavimas su šaligatviais ir apšvietimu) – 945 m (6 m plotis), 1,550 tūkst. Eur;
- Galinės k., Aukštųjų Rusokų vs., Mažosios Riešės vs. Galinės ir Kalno gatvių (VL9812; VL9813; VL9814; VL7972) nuo valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5237 iki valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5214, **Avižienių sen.** kapitalinis remontas (asfaltavimas, šaligatviai, apšvietimas, autobusų stotelė, paviršinių lietaus nuotekų sprendiniai) – 580 m (6 m plotis), 1038 tūkst. Eur;
- VL7980 Kernavės g., **Avižienių sen.** (asfaltavimas, šaligatvis, apšvietimas) – 480 m (6 m plotis), 500 tūkst. Eur;
- VL9906 Pievų g., **Riešės sen.** (asfaltavimas) – 600 m (4,5 m plotis), 283 tūkst. Eur;
- VL7448 Česlovo Milošo g., **Zujūnų sen.** (asfaltavimas) – 1522 m (6 m plotis), 1063 tūkst. Eur;
- VL7392 Dangaus g., **Zujūnų sen.** (asfaltavimas) – 805 m (5,5 m plotis), 573 tūkst. Eur;
- VL7440 Kopyčninkų g., **Zujūnų sen.** (asfaltavimas) – 300 m (4,5 m plotis), 178 tūkst. Eur;
- VL7507 Naujoji g., VL7508 Mokyklos g., **Paberžės sen.** (asfaltavimas, šaligatvis) – 283 tūkst. Eur;
- VL7430 Salotės g., **Zujūnų sen.** (šaligatvis) – 550 m, 98 tūkst. Eur;
- VL8295 Plačioji g., **Riešės sen.** (šaligatvis) – 789 m, 143 tūkst. Eur;
- VL8147 Draugystės g., VL8149 Pakrantės g., Bezdonių k., **Bezdonių sen.** (asfaltavimas) – 611 m (4,0-4,5 m plotis), 293 tūkst. Eur;
- VL8340 Margių g., Kalvelių k., **Kalvelių sen.** (asfaltavimas su šaligatviu) – 165 m (5,5 m plotis), 283 tūkst. Eur;
- VL2511 Privažiuojamoji gatvė prie Lavoriškių nuo kelio Nr. 5223*** Buivydžiai-Lavoriškės-Kena (prie kapinių), Lavoriškių k., **Lavoriškių sen.** (asfaltavimas) – 547 m (4,0–4,5 m plotis), 248 tūkst. Eur;
- VL7658 Gamyklos g., Raudondvario k., **Nemenčinės sen.** (asfaltavimas) – 400 m (5 m plotis), 218 tūkst. Eur;
- VL7748 Vasaros g., **Nemenčinės m. sen.** (šaligatvis) – 475 m (1,5 m plotis), 145 tūkst. Eur;
- VL9621 Dvarietės g., Veriškių k., **Sužionių sen.** (šaligatvis) – 95 m (1,5 m plotis), 55 tūkst. Eur;
- VL8441 Kerpių g., Galgių k., **Mickūnų sen.** (asfaltavimas) – 415 m (5,5 m plotis), 286 tūkst. Eur;
- VL8830 Žemaitėlių g., Žemaitėlių k., **Rukainių sen.** (asfaltavimas) – 469 m (3,5 m plotis), 287 tūkst. Eur;
- VL8409, VL8479 Užupio g., Mickūnų mstl., **Mickūnų sen.** (šaligatvis) – 580 m (1,5 m plotis), 377 tūkst. Eur;
- VL7108 Ežero g., Didžiasalio k., **Nemėžio sen.** (asfaltavimas) – 720 m (5,5 m plotis), 167 tūkst. Eur;
- VL1124 Juodoji Vokė – Merešlėnai, **Pagirių sen.** (asfaltavimas) – 3040 m ilgis (6,5 m plotis), 557 tūkst. Eur;
- VL8069 Vingių g., Pagirių k., **Pagirių sen.** (asfaltavimas) – 590 m ilgis (6 m plotis), 226 tūkst. Eur;
- VL8736 Upės g., Juodalaukio k., **Šatrininkų sen.** (asfaltavimas) – 1268 m ilgis (4,5 m plotis), 180 tūkst. Eur;
- VL8731 Medelyno g., Grigaičių k., **Šatrininkų sen.** (asfaltavimas) – 1935 m ilgis (5 m plotis); 279 tūkst. Eur;
- VL9423 Juodžių g., Marijampolio k., **Marijampolio sen.** (asfaltavimas, šaligatvis) – 800 m ilgis (5 m plotis), 328 tūkst. Eur;
- VL8052 Krantinės g., Vaidotų k., **Pagirių sen.** (šaligatvis, apšvietimas) – 540 m, 244 tūkst. Eur.

Didžiausią ūkių skaičių turinti savivaldybė visoje Vilniaus apsk.

Bendras ūkių žemės plotas:
daugiau nei 16940,78 ha
Vyrauja 0,5-5 ha (1568) ūkiai (36 proc.)
Vienam ūkiui tenka 3,65 ha

Teritorija užima 212 900 ha bendro žemės ūkio ploto

iš jų žemės ūkio naudmenos sudaro
80 157,13 ha (beveik 40 %)

3 237 subjektai

deklaravo žemės ūkio naudmenų plotus
rajone 2024 m. (2023 m. – 3 359)

bendras plotas – 47 909 ha (2023 m. – 47 045 ha)

10 236 058 Eur

prašoma bendra tiesioginių išmokų
paramos suma



Veikiančių ūkių **skaičius**

2024 metais mažėjo

2024m.

227 (-63 %)
įregistruota naujų ūkių

4 645 (-0,15 %)
bendras ūkių skaičius

2023m.

614
įregistruota naujų ūkių

4 652
bendras ūkių skaičius



DIDŽIAUSIĄ ŪKIŲ SKAIČIŲ TURINTI SAVIVALDYBĖ VISOJE VILNIAUS APSKRITYJE



2 513 (54%)
augalininkystė



1 576 (34%)
mišrus žemės ūkis



407 ūkiai (9%)
gyvulininkystė





Melioracijos darbai 2024

- ✓ 108,340 km – prižiūrėta, suremontuota griovių ir sureguliuotų upių (36,359 km daugiau nei 2023 m.)
- ✓ Pašalinta 0,6 km avarinių rinktuvų gedimų
- ✓ Eksploatuota Pikeliškių vandens kėlimo stotis (nusausta 155 ha)
- ✓ Prižiūrėtos 6 tvenkinių užtvankos, atstatyta Galinės tilto būklė

180 tūkst. Eur

skirta melioracijos darbams iš
valstybės biudžeto 2024 m.

342 tūkst. Eur

2024 m. skyrė Savivaldybė.
Tai apie 16 tūkst. Eur daugiau
nei 2023 m.



VALSTYBĖS PARAMA




2024 m.

surinktos 254 paraiškos
(2023 m. – 282)

Paraiškos paramai gauti
pateiktos už 7 691 bičių šeimas
(2023 m. – 7 982)

Išmokėta už 44,5 tūkst. Eur
(2023 m. – 46,2 tūkst. Eur)

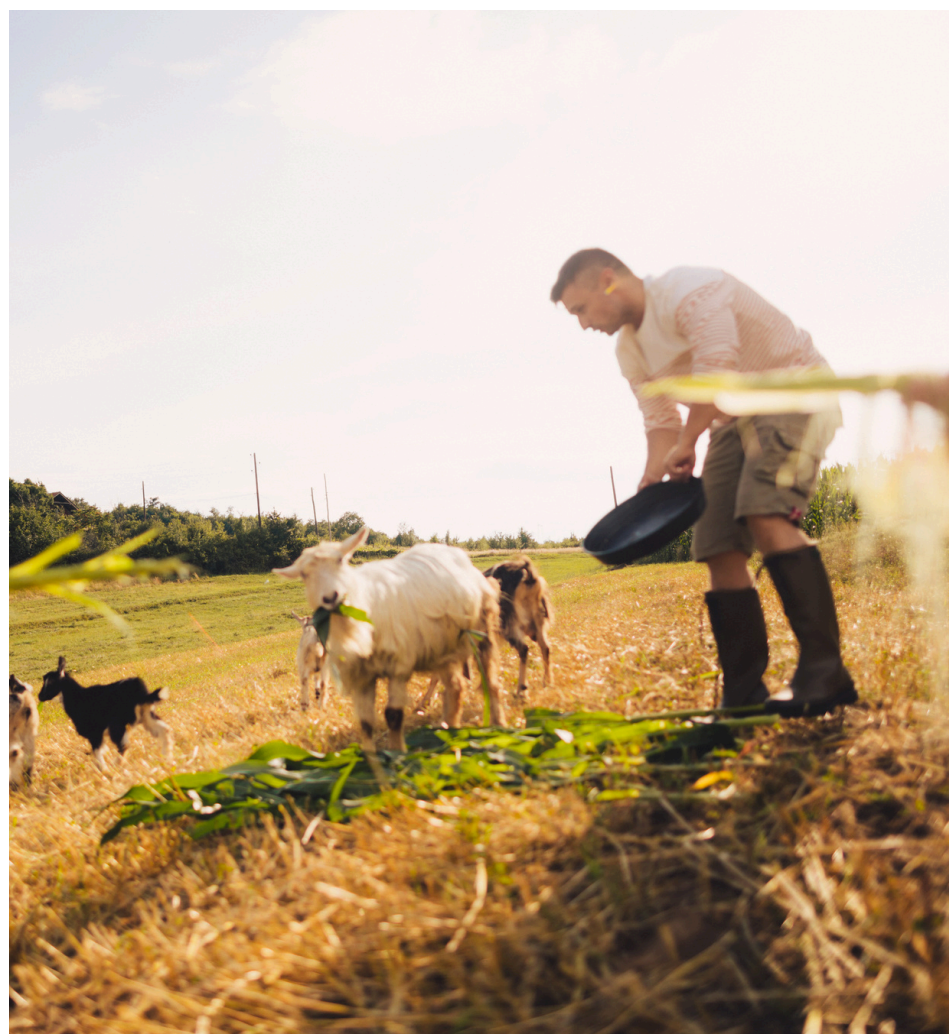

Iš Aplinkos teršimo
mažinimo priemonių
sąmatos už medžiojamų
gyvūnų daromą žalą rajono
gyventojams 2023 m.
išmokėta **57,3 tūkst. Eur**
(2023 m. – 92,4 tūkst. Eur)

AUDROS PADARINIAI

Liepos 28–29 d. per Lietuvą praūžusi gausaus lietaus lydimą audrą pridarė daug žalos ūkininkų pasėliams

preliminari žala 1 163 358,05 Eur

nukentėjo 64 ūkiai

Ūkininkai teikia prašymus dėl valstybės paramos už žalą, patirtą dėl krizės ar ekstremalios situacijos skyrimo.

Savivaldybė įvertinus gautą informaciją nustatytai tvarkai, teikia išvadas Finansų ministerijai dėl kompensacijų skyrimo



VERTINAMA IR PUOSELĖJAMA ŽEMDIRBYSTĖ



15-osios Vilniaus rajono artojų varžybos

I vieta – Rafal Karneckij iš Lavoriškių seniūnijos, II vieta – Ernest Tylinga iš Sudervės seniūnijos, III vieta – Rafal Butkevič iš Mickūnų seniūnijos



Derliaus šventės metu Skaidiškėse apdovanoti geriausieji Vilniaus rajono ūkininkai

padovanoti 500 Eur vertės kuponai



Vilniaus apskrities ūkininkų apdovanojimai už nuopelnus šalies žemės ūkiui

Vilniaus rajono ūkininkai: Eglė Gvozdovič už pažangų daržininkystės ūkio vystymą, Zenon Borkovskij už perspektyvų ekologinio augalininkystės ūkio plėtojimą, Marius Jukonis už nuoširdų darbą uogininkystės ūkyje

2024 m.

**paremtas 51 verslo ir ūkio
subjektas**

**paramos suma – 70 tūkst. Eur
(2023 m. – 50 tūkst. Eur)**

VERSLUMO SKATINIMAS

**Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo
ir vidutinio verslo rėmimo fondas**

finansinė parama smulkiojo ir vidutinio verslo
subjektams, įregistruotiems ir vykdančioms
veiklą Vilniaus rajone




VIEŠASIS TRANSPORTAS

Vilniaus rajono savivaldybės viešojo priemiestinio transporto tinklą sudaro **59** reguliaraus susisiekimo maršrutai, kurie sugrupuoti į **10 krypčių**

2024 m. sukurtas Vilniaus rajono autobusų maršrutų žemėlapis



KELEIVIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL MARŠRUTUS

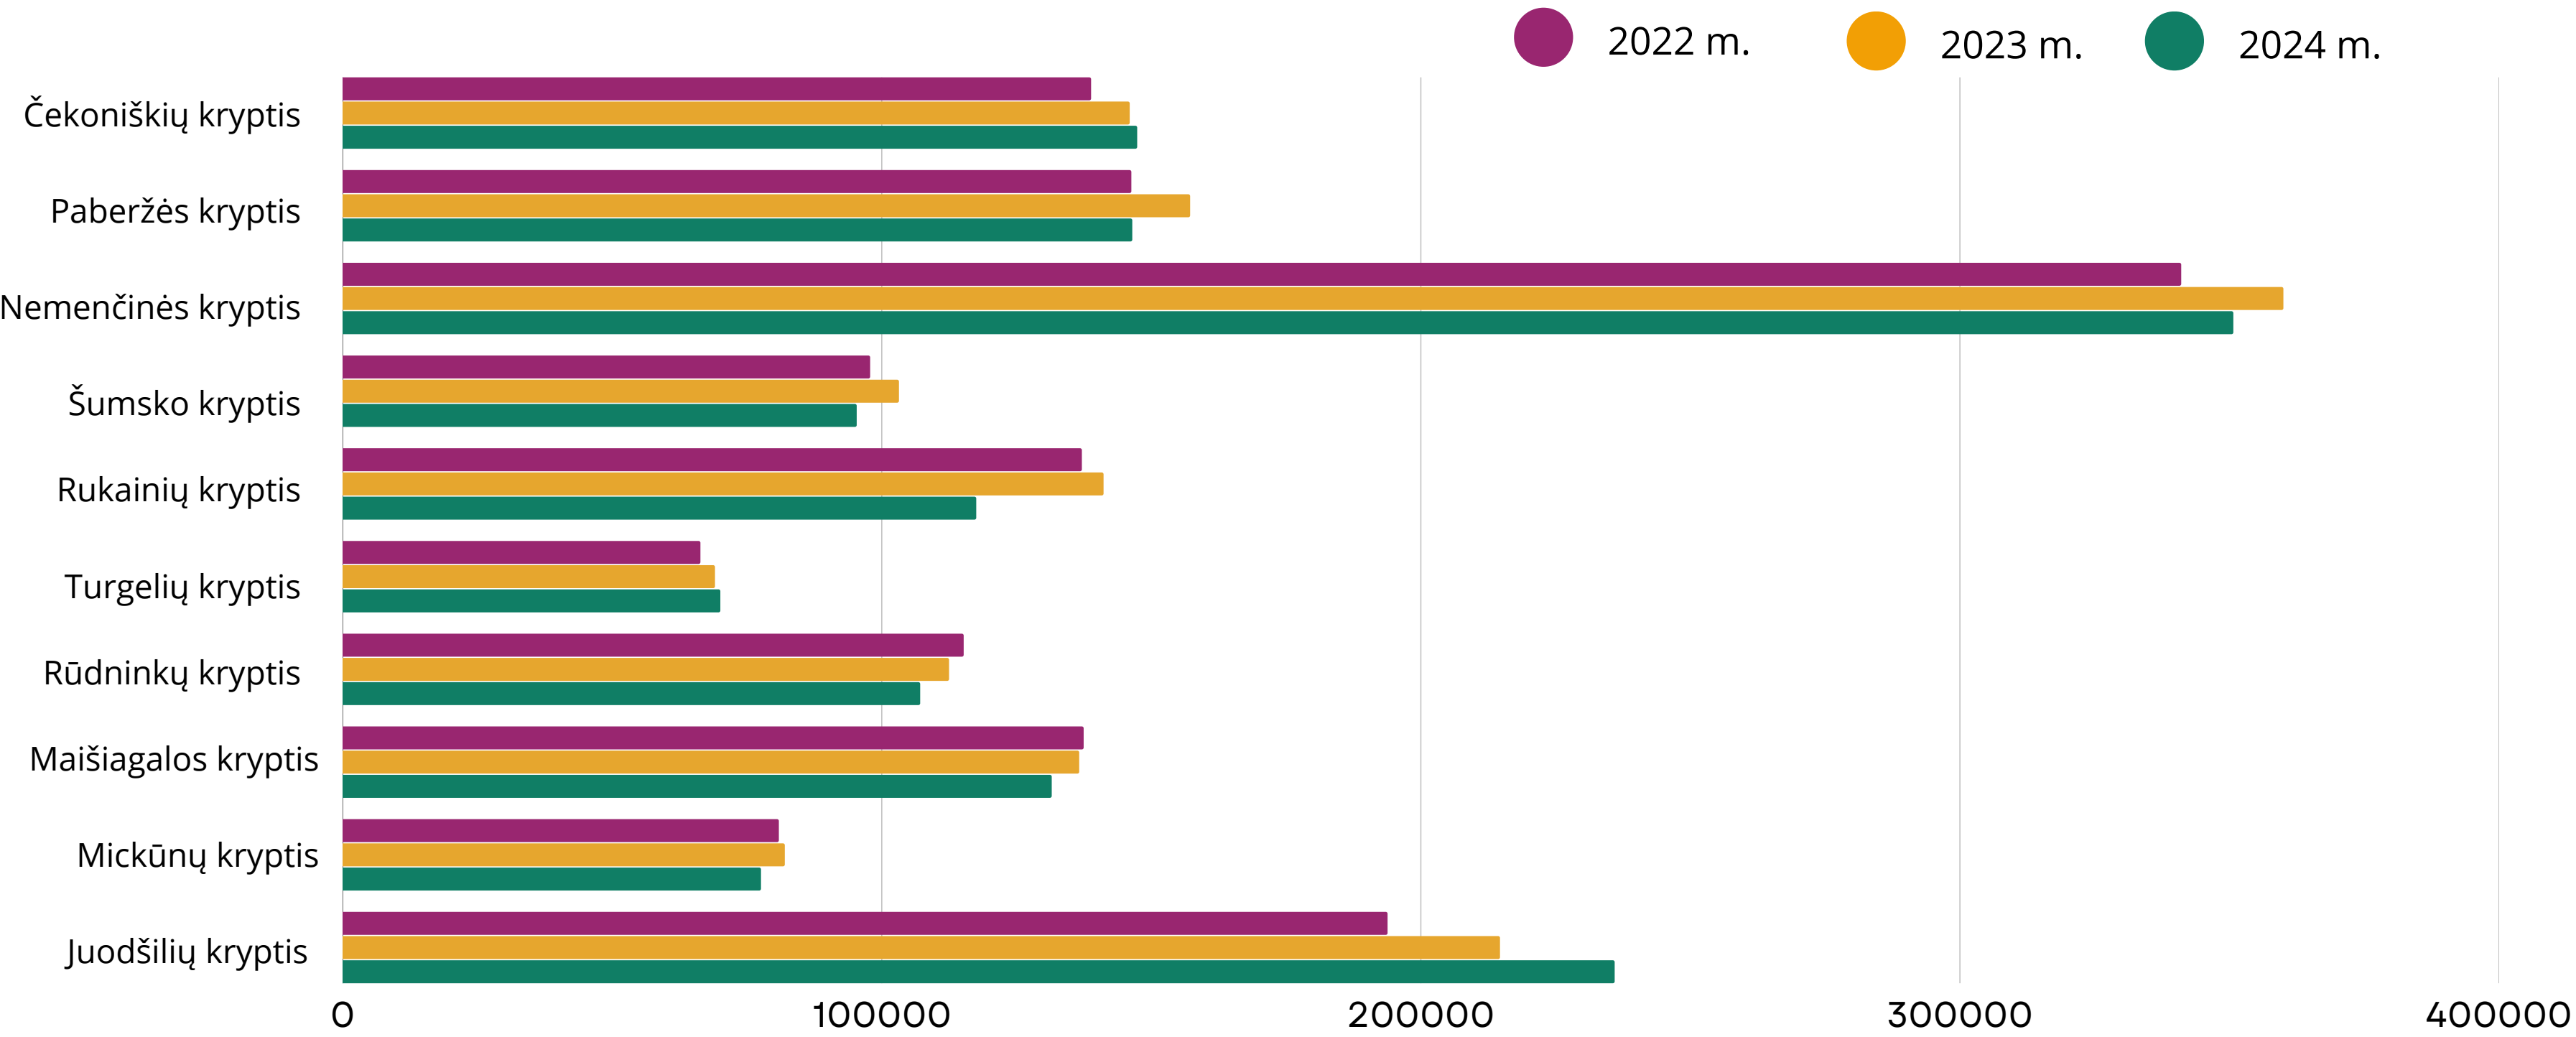

LENGVATOS BILJETAMS

Vilniaus rajono savivaldybė taiko lengvatas vietinio (priemiestinio) keleivinio transporto važiavimo bilietams:

50 % nuolaida
pensininkams

100 % nuolaida
80 m. +

80 % nuolaida
bendrojo ugdymo
programų mokiniams

Kompensacijų
sumos už teiktas
nuolaidas
važiavimo
bilietams

660 342 Eur

2022 m.

775 964 Eur

2023 m.

780 229 Eur

2024 m.




VEŽĖJAMS UŽ PASLAUGAS MOKAMOS SUMOS

- Savivaldybė, pagal Keleivių vežimo sutartis, moka vežėjams už faktiškai įvykdytą ridą. Maršrutų reisų nulinė rida į faktiškai įvykdytos ridos ataskaitą netraukiama
- Metinė Vilniaus rajono vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutų rida – **4 518 371 km**
- 2024 m. už keleivių vežimo paslaugas vežėjams buvo sumokėta **3 173 175 Eur**
- **Dėl įvairių ekonominių veiksnių padidėjus paslaugų kainai, padidėjo savivaldybės biudžeto išlaidos**

2025 m. biudžeto poreikis keleivių vežimo paslaugoms užtikrinti viršija 3 mln. Eur

Vežėjams už keleivių vežimo paslaugas mokamos sumos

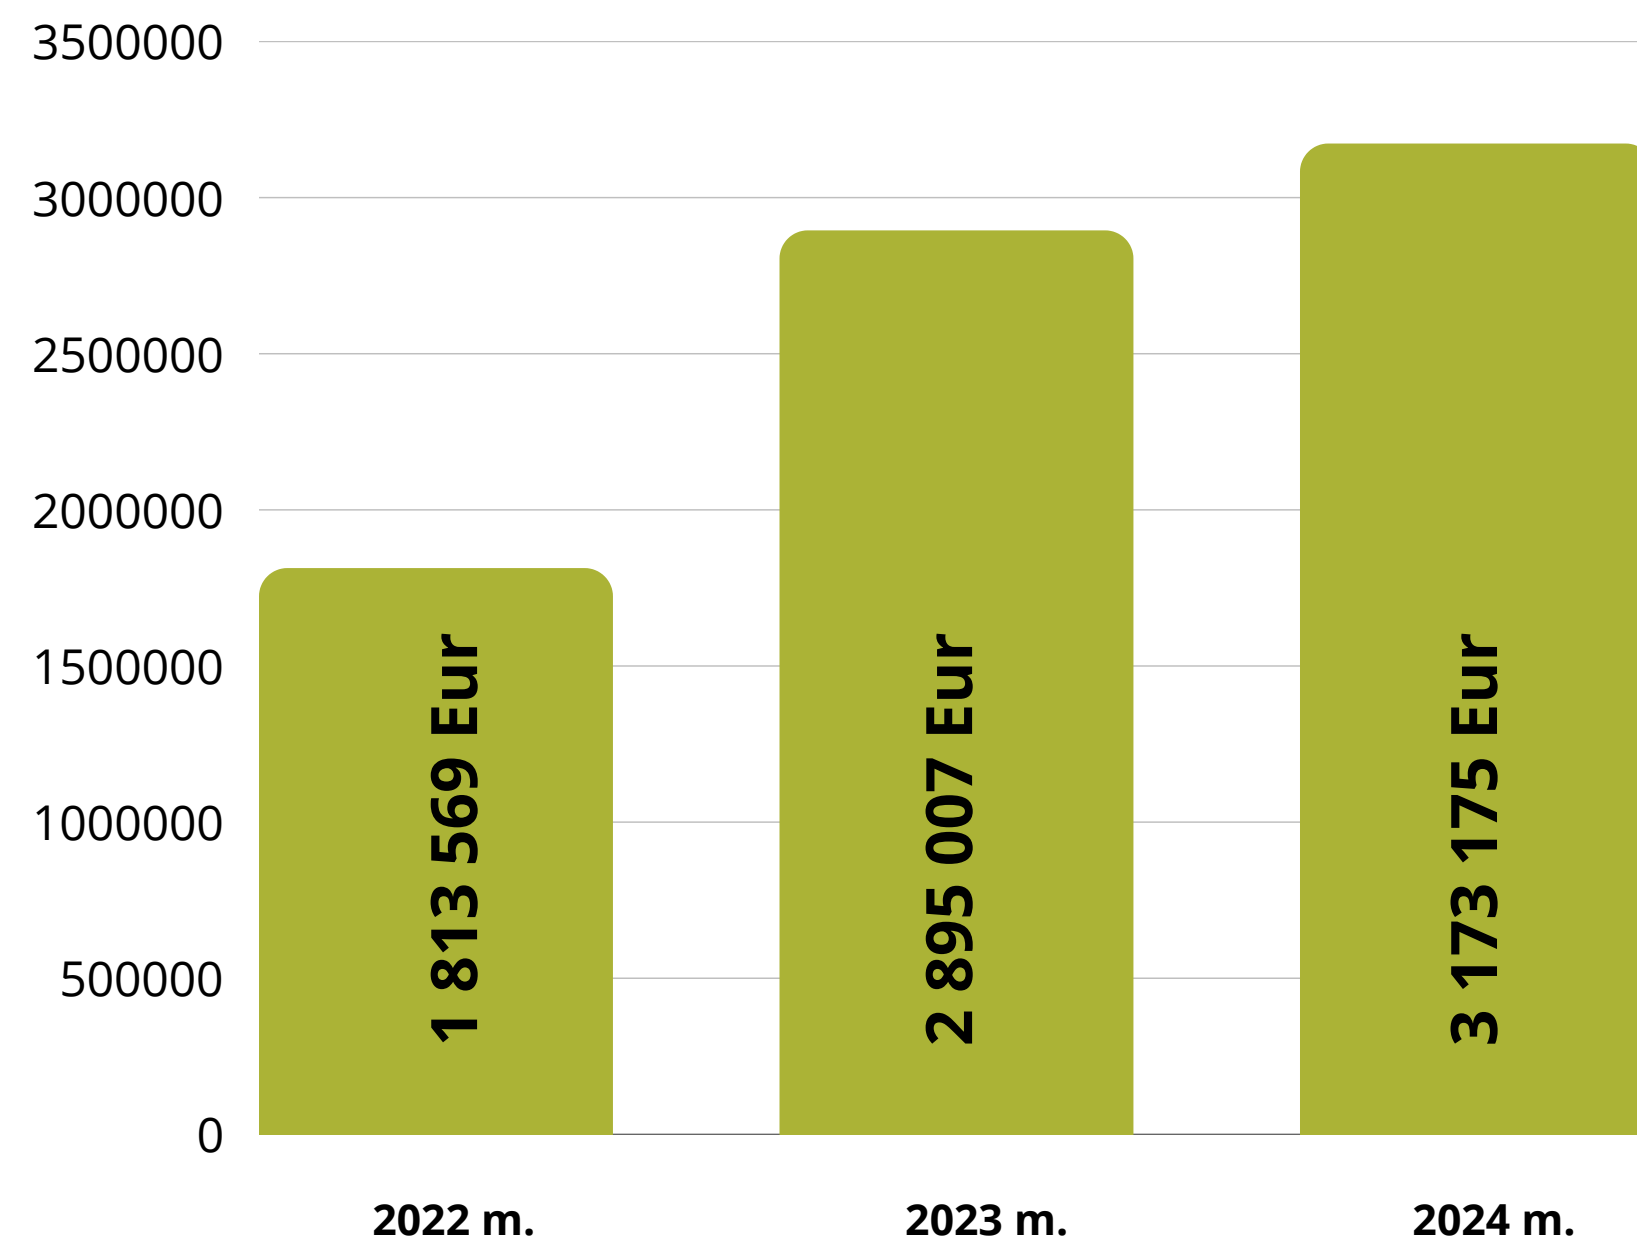


KULTŪROS IR SPORTO VEIKLŲ RĖMIMAS



Sporto projektų finansavimas iš Savivaldybės biudžeto

30-čiai sporto klubų skirta 50 000 Eur

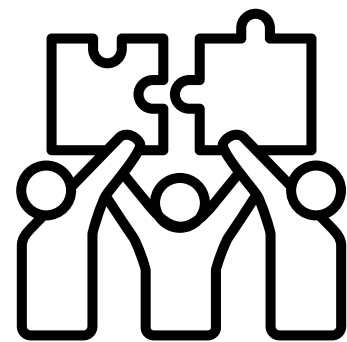

Kultūros projektų finansavimas iš Savivaldybės biudžeto

Gautos 38 paraiškos, finansuota – 30
Panaudota lėšų – 68 070 Eur
(18 070 Eur buvo skirta papildomai)





KULTŪRA, SPORTAS IR TURIZMAS

- ▶ Nemenčinės kultūros centras – 2 589 400 Eur
- ▶ Rudaminos kultūros centras – 2 513 900 Eur
- ▶ Vilniaus krašto etnografinis muziejus – 918 077,93 Eur (iš jų savivaldybės – 913 400,00 Eur, biudžetinių įstaigų pajamos – 4 677,93 Eur)
- ▶ Vladislavo Sirokomlės muziejus – 373 900 Eur
- ▶ Vilniaus rajono savivaldybės centrinė biblioteka – 2 083 300 Eur
- ▶ Vilniaus rajono savivaldybės sporto centras – 809 796,90 Eur
- ▶ Kultūros ir sporto projektams (skyriuje) – 118 070 Eur

Iš viso 2024 m.: 9,4 mln.
(1 mln. daugiau nei 2023 m.)

VERBŲ TRADICIJA IR APDOVANOJIMAI UŽ NUOPELNAS



**Siekama Vilniaus krašto verbų rišimo
tradiciją įtraukti į UNESCO
Nematerialaus Pasaulio paveldo sąrašą**



**Pirmą kartą organizuoti
apdovanojimai už nuopelnus
Vilniaus kraštui ir jo žmonėms**



**Mozūriškių dvare bus įkurtas
Verbų muziejus**





PARAMA JAUNOMS ŠEIMOMS



► Nuo 2025 m. sausio 1 d. skiriama vienkartinė **165 Eur** piniginė išmoka naujagimio susilaukusiems Vilniaus rajono tėvams

► **Padidintas Vilniaus rajono kūdikio kraitelis**
(vertė padidinta nuo 50 iki 150 Eur)

Igyvendinimas užtruko 6 mėnesius

- 2024-04-26 parengtas projektas pristatytas Tarybos pasėdyje
- 2024-05-24 svarstytas projektas. Projektui pritarta
- **2024-06-25 paruošta pirkimo paraiška**
- 2024-08-29 pirkimo paraiška priimta vykdymui
- 2024-09-13 paskelbtas konkursas
- 2024-11-05 paskelbtas nugalėtojas
- **2024-11-25 pasirašyta sutartis**
- 2024-12-27 pristatytas kraitelis

JAUNIMO REIKALAI

- Jaunimo vasaros užimtumo programa (12 000 Eur)
 - Jaunimo iniciatyvos projektai (15 000 Eur)
 - Jaunimo savanoriškos tarnybos finansavimas (3 840 Eur)
 - Dalyvaujamas biudžetas bendrojo ugdymo mokyklose (15 200 Eur)
 - Dalyvaujamas biudžetas savivaldybėje (100 000 Eur)
-
- Bendradarbiaujant su Socialinės gerovės skyriumi mobiliam darbui su jaunimu plėtoti Maišiagalos miestelyje skirta 5 000 Eur
 - Bendradarbiaujant su Socialinės gerovės skyriumi skirti 5 000 Eur jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms, organizuojant renginius, skirtus smurto prevencijos temai (VŠĮ „Ne imti, bet duoti“, Vilnius social club, VŠĮ Signum inter)



Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo taryba



„Stiprūs įvairovėje“
VŠĮ „Jaunimo asmeninio tobulėjimo centras“

JAUNIMO VASAROS UŽIMTUMO PROGRAMA

skirta 12 000 Eur (išmokėta suma 6 993,75 Eur)
Įdarbinta 17 jaunų asmenų nuo 14 iki 17 metų
amžiaus, 9 skirtingi darbdaviai



JAUNIMO INICIATYVOS PROJEKTAI

skirta 15 000 Eur, išnaudota suma 14 800 Eur
5 projektai skirtingose Vilniaus rajono vietovėse



JAUNIMO REIKALAI



Jaunimo politikos ir teisių užtikrinimo biudžetas

50 000 Eur

Išnaudota 33 993,74 EUR

Jauno kariūno lyderio programa

Pasirašytos sutartys su 5 gimnazijomis
Iš viso programoje dalyvauja 17 asmenų

Jaunimo savanoriškos tarnybos finansavimas

išnaudota 3 840 Eur, įtraukta 13 naujų SVO
Sulaukta 48 naujų savanorių registracijų
7 nauji savanoriai

DALYVAUJAMASIS BIUDŽETAS

Dalyvaujamasis biudžetas bendrojo ugdymo mokyklose

Išnaudota 15 200 Eur, dalyvavo 19 mokyklų

Dalyvaujamasis biudžetas savivaldybėje

Sulaukta 20 projekto idėjų, į balsavimo etapą perduota 16

Mažos vertės projektas: 9 280 EUR


Vidutinės: 49 450 EUR

Didelės: 54 159,12

Papildomai skirta: 28 089,2 Eur projektų įgyvendinimui

Bendra suma: 112 889,20 Eur

dalyvauk.vrsa.lt



Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazija



EFEKTYVESNIS SAVIVALDYBĖS ŪKIO NAUDOJIMAS

Įdiegta **telimetrija** ir **paženklinti** visi administracijos ir seniūnijų automobiliai

**sumažintas
automobilių parkas**

**nuo 43 iki 23
transporto priemonių**

- 17 perduota pavaldžioms įstaigoms
- 1 utilizuotas
- 5 parduoti aukciono būdu

Gautos lėšos 17 221 Eur

Palyginus su 2023 metais:

- sutaupyta kurui apie 6 tūkst. Eur
 - 2023 m. 29 836 Eur, 2024 m. 23 642 Eur
- su draudimais ir remontais **sutaupyta apie 10 000 Eur**

ŽINGSNIS ARČIAU GYVENTOJŲ: KOMUNIKACIJAI SKIRTOS LĖŠOS

- Visuomenės informavimas
- Aiški, nuosekli komunikacija kuria pasitikėjimą, kad savivalda veikia sąžiningai ir atsakingai
- Skatinamas žmonių įsitraukimas į įvairias veiklas, vietos sprendimų priėmimą

Investicijos į skaidrią ir įtraukią savivaldos veiklą:

Planuota: 180 000 Eur

Sutaupyta: 35 000 Eur

Panaudota: 144 730,09 Eur

Likutis: 269,91 Eur



Viešinimo
išlaidos

61 311,12 Eur

Viešųjų ryšių
paslaugos

71 311,03 Eur

Kvalifikacijos
kėlimas

5 625,00 Eur

Video ir foto
įranga

4 075,50 Eur

Programinės
įrangos licencijos

2 407,44 Eur

VILNIAUS RAJONO GYVENTOJO KORTELĖ

Tik Vilniaus rajone registruotiems gyventojams skirtos naudos – nuolaidos ir specialūs pasiūlymai prekėms, paslaugoms, renginiams

Vilniaus rajone veiklą vykdančio verslo, gamintojų, paslaugų teikėjų ir renginių organizatorių veiklos stiprinimas

**Numatoma pristatyti
2025 m. pavasarį**

**Fizinė ir elektroninė kortelės
versija (mob. programėlė)**

Programėleje gyventojai galės ne tik pasinaudoti specialiai jiems siūlomomis nuolaidomis, bet taip savo telefone galės sekti pagrindines Vilniaus rajono naujienas, sužinoti apie savivaldybės renginius, o ateityje planuojama praplėsti programėlės funkcionalumą, suteikiant galimybę pranešti apie pastebėtą problemą, įdiegiant turistinį žemėlapi ir kt. Programėlė leis greitai ir patogiai pasiekti gyventojus, kai reikės dalintis svarbia informacija

Kortelę gyventojams įgaliotas išduoti Civilinės metrikacijos skyrius

2024 m. išleista apie 24 tūkst. Eur



KIBERNETINIS SAUGUMAS (NE)APSIMOKA?

Šiuolaikiniame skaitmeniniame pasaulyje, kur kibernetinių atakų mastas ir sudėtingumas auga, **kibernetinis saugumas tampa būtinybe**, o ne prabanga

KODĖL SVARBU?

- Duomenų apsauga
- Veiklos tęstinumas
- Reputacija
- Teisinis reglamentavimas

**KIBERNETINIO SAUGUMO
DIREKTYVA TIS2**

**KIBERNETINIO SAUGUMO
ĮSTATYMAS**



01 ŽMONĖS

Vadovo sąmoningumas

Tinkamas dėmesys IT specialistams

Visų darbuotojų reguliarūs mokymai ir informuotumo didinimas

02 PROCESAI


Tinkamas IT procesų ir veiksmų dokumentavimas

Rizikų vertinimas

Pirmiau politika, po to priemonės

03 TECHNOLOGIJOS

Techninės ir organizacinės priemonės saugumo stiprinimui apimančios duomenis, informacines sistemas, įrenginius, vidinį tinklą, išorinį tinklo perimetrą, fizinę kontrolę



01. APSAUGA

Perimetro apsauga
KDV apsauga
Tinklų ir IS apsauga
Duomenų apsauga
Mobiliųjų telefonų apsauga

02. TEISIŲ VALDYMAS

Naudotojų teisių valdymas
Privilegiuotų naudotojų teisių valdymas
Slaptažodžių valdymas
Įrenginių prisijungimo teisių valdymas

03. PREVENCIJA

Tinklo segmentavimas
Kopijų darymas
Pažeidžiamumų skenavimas
Programinės įrangos atnaujinimas
Pažangių sprendimų naudojimas

04. MONITORINGAS

Duomenų judėjimo stebėjimas
Vartotojų veiklos stebėjimas
Apgaulingo tinklo stebėjimas
Įvykių tinkle ir perimetre stebėjimas
Centralizuotas tinklo įrenginių stebėjimas
Centralizuotas KDV, mob. įrenginių stebėjimas

05. VALDYMAS

Saugos valdymas,
automatizavimas ir reagavimas
Valdomas grėsmių aptikimas ir reagavimas



Kibernetinio saugumo užtikrinimo etapai: TECHNOLOGIJOS



KIBERNETINIS SAUGUMAS

Nėra tik IT problema

Strateginis prioritetas, reikalaujantis visų organizacijos lygių įsitraukimo

Jeigu galvojate, kad atitiktis yra brangi, pamėginkite neatitikti ... :)

P. S. prevencija yra pigesnė nei pasekmių šalinimas

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

- 2023 m. gruodį patirto kibernetinio incidento padarinių šalinimo suma, įskaitant darbuotojų viršvalandžius ir darbą savaitgaliais, siekia apie 0,8 mln. Eur
- Nutarta pagal galimybes naudoti valstybės teikiamas paslaugas – pereita prie valstybinės dokumentų valdymo sistemos DBSIS, duomenys bus laikomi valstybiniame duomenų centre ir kt.
- Įsigyta išplėstinė grėsmių aptikimo ir reagavimo platforma ESET XDR visoms darbo vietoms bei serveriams
- Įsigijome VDC papildomus „FortiGate 120G“ įrenginius – tai aukštos klasės tinklo saugumo ugniasienės
- Įdiegėme centralizuotą spausdintuvų sistemą – keli bendro naudojimo spausdintuvai vietoje 100 mažų
- Įsigyta nauja tarybos posėdžių balsavimo ir transliavimo sistema
- Vidinių savivaldybės procesų skaitmenizavimas ir naujų funkcionalumų kūrimas:
 - kompensacijos už transportą mokyklų darbuotojams skaičiuoklė
 - interneto svetainė su el. balsavimo galimybe dalyvaujamojo biudžeto projektui
 - el. balsavimo sistema darbuotojams
 - mokymų platforma



DARBUOTOJŲ ĮSITRAUKIMO TYRIMAS



2024 m. sausio 16 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvo sudaryta Pokyčių grupė.

2024 m. pirmą kartą atliktas Darbuotojų įsitraukimo tyrimas.

Tyrimo tikslas: įvertinti esamą situaciją organizacijoje („silpnybės“ ir „problemos“, gyventojų interesai ir lūkesčiai, kt.) ir numatyti tobulinimo veiksmus.

Pagrindiniai tyrimo rezultatai

Tobulintinos sritys:

- Vidinė komunikacija ir bendradarbiavimas
- Profesinio augimo galimybių stiprinimas
- Vidurinės grandies vadovų darbo su pavaldiniais stiprinimas
- Darbuotojų aktyvumo ir atsakomybės ėmimosi skatinimas

Veiksmai 2025 metams

Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, bus planuojami kvalifikacijos tobulinimo renginiai, kurie prasidės jau šių metų sausio mėnesį



KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 2024 METAIS

Per metus buvo organizuoti įvairūs seminarai ir mokymai, skirti tam tikrų sričių specialistams.

Didelį dėmesį kreipėme **privalomiems visų darbuotojų mokymams:**

- Balandžio 18 d. vyko Valstybinės darbo inspekcijos konsultacinis seminaras psichologinio smurto tema visiems savivaldybės darbuotojams (įskaitant seniūnus ir seniūnijų darbuotojus)
- Gegužės 31 d. įvyko pirmasis Vilniaus rajono savivaldybės administracijos bendruomenės susitikimas – darbuotojų konferencija. Pradėjome tradiciją suburti mūsų bendruomenę, aptarti darbus. Jame buvo pristatytas Darbuotojų įsitraukimo tyrimas
- Spalio 18 d. vyko mokymai „Teisinių dokumentų kūrimas (teisėkūra): raštai, atsakymai, teisės aktai ir administraciniai sprendimai“ visiems savivaldybės darbuotojams (įskaitant seniūnus ir seniūnijų darbuotojus)
- Spalio 30 d. vyko Konsultacinis seminaras psichologinio smurto (mobingo) darbo aplinkoje, tema visiems savivaldybės darbuotojams (įskaitant seniūnus ir seniūnijų darbuotojus)

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ PERŽIŪRA, KARJEROS GALIMYBĖS IR LANKSTUMO DIDINIMAS

Tikslas: įgyvendinti lankstesnę valstybės tarnautojų karjeros galimybių sistemą.

Veikla:

„Iškarjerinimo“ procedūros:

- Nustatyta, kad „iškarjerinimo“ procedūros galėjo būti taikomos tik Centralizuoto vidaus audito skyriaus tarnautojams.
- **„Neiškarjerintas“ nei vienas valstybės tarnautojas.**

VRSA nebuvo pakankamai valstybės tarnautojų pareigybių, kurios pagal įstatymų reikalavimus atliktų viešojo administravimo funkcijas, nes darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis administraciniai sprendimai negali būti legitimūs. Todėl buvo organizuoti konkursai į svarbias karjeros valstybės tarnautojų pozicijas: pvz. jaunimo reikalų koordinatoriaus, sveikatos reikalų koordinatorius ir pan.

Į struktūrinius padalinius įtrauktos naujos pareigybės, numatytos Valstybės tarnybos įstatyme (patarėjo, patarėjo, turinčio pavaldžių asmenų, vyresniojo patarėjo ir pan.).



ADAPTACIJA IR MENTORYSTĖ

Tvarkos aprašas: 2024 m. gegužės mėn. patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, adaptacijos ir mentorystės tvarkos aprašas.

Tikslas: efektyvus darbuotojo adaptacijos procesas bei supažindinimas su padalinio funkcijomis ir teisės aktais.

2024 m. **mentorystės programa buvo pritaikyta 25 naujiems darbuotojams**, taip užtikrinant efektyvų darbuotojų integravimą į įstaigos veiklą.



DARBUOTOJŲ KAITA

2024 m. tarnybos ar darbo santykius nutraukė 64 darbuotojai (pagrindinės priežastys: dėl pensijinio amžiaus, darbininkų sezoninė kaita, darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva):

1 įstaigos vadovas (Administracijos direktorius);

Karjeros valstybės tarnautojai (11):

- 3 skyrių vedėjai
- 1 seniūnas
- 7 specialistai

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį (52):

- 28 specialistai
- 23 darbininkai

Priimta 80 darbuotojų:

Karjeros valstybės tarnautojai (9):

- 1 vyriausiasis patarėjas
- 1 skyriaus vedėjas
- 2 seniūnai
- 5 specialistai

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį (71):

- 47 specialistai
- 24 darbininkai

Perkelta tarnybinio kaitumo būdu 15 valstybės tarnautojų iš kitų įstaigų:

- 3 patarėjai
- 1 skyriaus vedėjas
- 7 specialistai



DARBUOTOJŲ KAITA (2)

Prieš metus patirta kibernetinė ataka ir ne tik ji, aiškiai parodė, kad **užtikrinant IT srities efektyvumą ir saugumą buvo atsilieinama**. Atsižvelgiant į tai, po struktūros pokyčių Ūkio skyrius tapo Aprūpinimo ir priežiūros skyriumi, kuris ir toliau užtikrins kasdienį sklandų savivaldybės darbuotojų darbą, o informacinių technologijų sritis pavesta naujai įkurtam Informacinių technologijų skyriui, priimta daugiau kompetentingų specialistų.

Pokyčiai VRSA 2024 m. yra apie 8–9 proc. (64 KVT/DS išėjo (nutraukė santykius) iš 722 bendro Administracijos darbuotojų KVT/DS sąrašo), tai yra labai nedidelė kaita. Pavyzdžiui, ministerijose, ekspertų teigimu, pastaruoju metu kaita buvo apie 15-20 proc.



DARBO UŽMOKESTIS IR KONKURENCINGUMAS

Iššūkiai

Vilniaus rajono savivaldybės administracija nėra pakankamai konkurencinga darbo užmokesčio atžvilgiu, ypač lyginant su Vilniaus miesto savivaldybe, kitomis Centrinės valdžios įstaigomis.

leškomos galimybės didinti visų darbuotojų darbo užmokestį





Vilniaus rajono
savivaldybė

VILNIAUS RAJONĄ KURIAME KARTU

